

VERBALE DELL'INCONTRO A LIVELLO DI UNITA' PRODUTTIVA TENUTOSI IL 28 MARZO 2013 FRA LA SOCIETA' RFI E LE OO.SS. FILT-FIT-UILT-UGL-FAST DELLA REGIONE CAMPANIA CONGIUNTAMENTE ALLA RSU N. 20 NAPOLI INFRASTRUTTURA

Sono presenti:

per la Società: Gallini – DTP NA; De Micco – PO NA-RC

per le OO.SS. i sigg. Taddeo, Lanzetta (FILT); La Rocca, Garofalo, Solombrino (FIT); Moccia (UILT); D'Aloia, Maiello (UGL); Crescenzo (FAST)

per le RSU i rappresentanti indicati all'allegato A

Le Parti si sono incontrate in data odierna in merito alla nota societaria del 13 marzo 2013 n. 346.

La Società in apertura, illustra i principali interventi di manutenzione straordinaria che interesseranno i Piani di Attività 2013, la cui documentazione sarà trasmessa in allegato al presente verbale.

In coerenza con quanto stabilito nel verbale del 21 maggio u.s. al punto 2.4, la Società dettaglia il numero delle lavorazioni notturne pianificate per il trimestre aprile-giugno 2013 per ciascun CdL della DTP di Napoli, la cui documentazione sarà trasmessa in allegato al presente verbale.

Alla luce di quanto rappresentato in termini di lavorazioni notturne, le Parti convengono di ricorrere alle modalità di cui al punto 2 del verbale del 21 maggio 2012 con l'articolazione oraria così come adeguata con il verbale del 24 settembre 2012.

In particolare le Parti convengono che il personale impegnato nelle attività interessate dal progetto "Collegamento Bivio Roma Nord-Bivio Roma Sud", relativamente agli interventi da effettuare in galleria Santa Chiara e nel periodo temporale che interessa la durata degli stessi, nel caso di prestazioni mattina/notte osserverà la seguente articolazione dell'orario di lavoro:

- mattino: 07.30-13.00

- notte: 21.00-04.36

Per detti lavori, qualora necessario, la durata delle prestazioni potrà essere prolungata fino al limite contrattuale pari a 9 ore. Le eventuali maggiori prestazioni saranno trattate nei modi previsti dal CCNL.

Si conviene inoltre che, al personale che per le attività di manutenzione di cui al piano di attività trimestrale, venga impiegato per supporto in impianti diversi da quello di appartenenza, sarà applicato quanto previsto dal vigente CCNL.

Le OO.SS./RSU chiedono di avere maggiori approfondimenti rispetto alle lavorazioni interessanti le attività delle rimanenti strutture di DTP con particolare riferimento agli impianti operativi di esercizio delle strutture organizzative GOT ed Ingegneria e Tecnologie (TLC, CMA, SSE, Squadra Ponti, IS Compartimentale).

La Società si impegna a fornire detti dati entro il 10 aprile p.v. Contestualmente sarà fornita la periodica consistenza di personale ai sensi dell'art. 2 punto 3.1.4. del contratto aziendale di Gruppo FS del 20 luglio 2012.

The bottom of the document features several handwritten signatures in black ink. On the left, there are two signatures, one above the other. In the center, there is a signature with the text "FIT la Rocca S." written below it. On the right, there are two more signatures, one above the other. The signatures are somewhat stylized and difficult to read.

Le Parti inoltre convengono su specifici incontri che si terranno alle ore 10.00 presso la sala riunioni A della DTP di Napoli secondo il seguente calendario:

- il giorno **11 aprile 2013**: turno in seconda della zona IS di Napoli Centrale, Organizzazione Zone SCC e problematiche in pendenza di cui al verbale del 12 dicembre 2012;
- il giorno **19 aprile 2013**: istituto della reperibilità.

PER LA SOCIETA'



PER LE OOSS


FILT CGIL

FIT CISL


UILTRAPORTI

UGL TRASPORTI

FAST FERROVIE



PER LA RSU N.20



COGNOME	NOME	MATRICOLA	IMPIANTO DI APPARTENENZA (specificare chiaramente)	RICHIESTA DI PERMESSO		Firma dei partecipanti
				retribuito	non retribuito	
ABBATE	PASQUALE	919151	Telecomunicazioni Zona 2 Napoli			
ACCARDO	ROSARIO	834924	Reparto Sede, Opere d'Arte, Fabbricati, Impianti Speciali NA	SI		<i>ACCARDO</i>
ALBANO	PATRIZIO	918758	Impianti di Segnalamento Zona Napoli Centrale	SI		<i>ALBANO</i>
BARONE	FELICE	918892	Impianti di Segnalamento Zona Nocera Inferiore			
BERNARDO	ANTONIO	839393	Tronco Lavori Telese			
BRONZO	VINCENZO	851180	Impianti di Segnalamento Zona Telese	SI		<i>BRONZO</i>
CAROTENUTO	ANIELLO	886913	Trazione Elettrica Zona Torre Annunziata			
CERBONE	GIUSEPPE	890954	Diagnostica NA			
CIGNI	MARIANO	850620	Nucleo Mezzi d'Opera NA			
DE MASI	LORENZO	898223	Trazione Elettrica Zona Minturno			
DE SIO	MASSIMILIANO	921413	Impianti di Segnalamento Zona Salerno			
DI SOMMA	PASQUALE	918911	Tronco Lavori Nocera Inferiore			
ESPOSITO	PAOLO	918134	Telecomunicazioni Zona SCC Napoli			
FICO	GENNARO	918156	Trazione Elettrica Zona Napoli Centrale		NO	<i>FICO</i>
FORDELLONE	CORRADO	898010	Impianti di Segnalamento Zona Rocca D'Evandro	SI		<i>FORDELLONE</i>
MAININI	VINCENZO	896977	Reparto Pianificazione Programmazione e Controllo UT Caserta			
MARINO	GIORGIO	855236	Squadra Ponti, Opere Metalliche NA			
MOCCIA	MARIANO	921404	REPARTO COORDINAMENTO ESERCIZIO INFRASTRUTTURE NA			
NUNZIATO	CARMINE	852369	Trazione Elettrica Zona Torre Annunziata			
PAGLIARA	ANTONIO	921386	Trazione Elettrica Zona Cannello		NO	<i>PAGLIARA</i>
PENNUCCI	NICOLA	853718	Tronco Lavori Avellino			
QUATTROCCHI	CINZIA	921306	CENTRO OPERATIVO ESERCIZIO RETE NAPOLI			
RUSSO	CARMINE	921389	Tronco Lavori Napoli Centrale	SI		<i>RUSSO</i>
SALVI	FRANCESCO	905429	Trazione Elettrica Zona Torre Annunziata	SI		<i>SALVI</i>
SCOGNAMIGLIO	RAFFAELE	903136	Reparto Logistica NA			
TORTORIELLO	MICHELE	903046	Tronco Lavori Baragiano			

Piano di attività anno 2013

Principali interventi di manutenzione straordinaria

Attivazioni e/o trasformazioni impiantistiche

Linea comp.le	Codice linea (D.M. 18/08/2006)	Tratta / Località	Attivazione
NAPOLI-BATTIPAGLIA	R8	Napoli C.le-Bivio Sarno	Adeguamento BAB tra Bivio Casoria e PC Vesuvio per attivazione ACC Bivio Roma Sud (PIR)
NAPOLI-BATTIPAGLIA	R8	Napoli C.le-Bivio Sarno	Adeguamento SCMT tra Napoli e PC Vesuvio per attivazione ACC Bivio Roma Sud (PIR)
NAPOLI-BATTIPAGLIA	J73/74	BIVIO CASORIA-PC VESUVIO	ATTIVAZIONE ACC "BIVIO ROMA SUD" (PIR)
NAPOLI-BATTIPAGLIA	R8	Napoli C.le-Bivio Sarno	Adeguamento SCC lunga percorrenza Sud per attivazione ACC Bivio Roma Sud (PIR)
NAPOLI-BATTIPAGLIA	J73/74	SALERNO	Innalzamento marciapiede binario VI


Principali interventi di manutenzione straordinaria

Attivazioni e/o trasformazioni impiantistiche

Linea comp.le	Codice linea (D.M. 18/08/2006)	Tratta / Località	Attivazione
ROMA NAPOLI AV/AC	AV/AC	PM Afragola - Bivio Roma Sud	Nuovo Collegamento diretto tra AV/AC Roma - Napoli e AV/AC Napoli - Salerno ESERCIZIO FUNZIONALE
FORMIA-NAPOLI	J57/58	STAZIONE DI SESSA A.	ALLUNGAMENTO MARCIAPIEDE 2° - 3° BINARIO E RAMPA DISABILI
CASSINO - NAPOLI	J61/62	Stazione di Capua	Attivazione sottopassaggio (PIR)
CASSINO - NAPOLI	J61/62	Pignataro	ATTIVAZIONE SOTTOPASSAGGIO (PIR) - 2 Fase finale "Realizzazione rampe di accesso sottopasso"
NODO DI NAPOLI		Napoli Centrale	Banalizzazione itinerari binari 16, 17, 18 e 19 e contestuale riconfigurazione SCMT

Principali interventi di manutenzione straordinaria

Attivazioni e/o trasformazioni impiantistiche

Linea comp.le	Codice linea (D.M. 18/08/2006)	Tratta / Località	Attivazione
NAPOLI-BATTIPAGLIA	J73/74	Angri	Trasformazione in fermata
FORMIA -NAPOLI	J57/58	MINTURNO	Trasformazione in P.C.
FORMIA -NAPOLI	J57/58	FRATTAMAGGIORE	Trasformazione in fermata
FORMIA -NAPOLI	J57/58	VILLA LITERNO	Innalzamento marciapiedi 4° e 5°
FORMIA -NAPOLI	J57/59	VILLA LITERNO	Innalzamento marciapiedi 1° , 2° , 3°
NAPOLI-FOGGIA	J71/72	TROIA	Soppressione impianto
 NAPOLI-BATTIPAGLIA	R8	Napoli S.Giovanni Barra	Soppressione PL Km 3+252 (Via Vigliene)

Principali interventi di manutenzione straordinaria

Attivazioni e/o trasformazioni impiantistiche

Linea comp.le	Codice Lin	Tratta / Località	Intervento / Indisponibilità	Note su fasi funzionali / Specifiche tecniche di circolazione
FORMIA-NAPOLI	J57/58	SESSA - FALCIANO	MIGLIORAMENTO SICUREZZA IN GALLERIA MASSICO	INTERRUZIONI DI LINEA IN PERIODO NOTTURNO, DA COMPATIBILIZZARE CON GLI INTERVENTI PROGRAMMATI SULLA LINEA ROMA - CASSINO - NAPOLI
BATTIPAGLIA - POTENZA	K136	Buccino - Romagnano	Consolidamento rilevato da Km. 116+600/900	INTERRUZIONI IPO NOTTURNA INTERVENTO DA CONFERMARE
NAPOLI-BATTIPAGLIA	J73/74	BIVIO S.L. - SALERNO	MIGLIORAMENTO SICUREZZA IN GALLERIA	interruzioni del binario dispari di 240' notturni, per 5 gg/settimana consecutivi a m.v.c. Interruzioni del binario Pari durata 180
CASERTA-CERVARO	J71/72	ARIANO - PIANEROTTOLO	Consolidamento gallerie	CONSOLIDAMENTO TRATTI DI RIVESTIMENTO DEGRADATO GALLERIA ARIANO

Principali interventi di manutenzione straordinaria

Attivazioni e/o trasformazioni impiantistiche

Linea comp.le	Co dic e Lin	Tratta / Località	Intervento / Indisponibilità	Note su fasi funzionali / Specifiche tecniche di circolazione
CASERTA- CERVARO	J71/ 72	Maddaloni Sup. - Frasso	Rinnovamento binario con risanamento della massicciata	Ipo notturne
CASERTA- CERVARO	J71/ 72	Orsara - Montaguto	Rinnovamento binario con risanamento della massicciata	Ipo notturne
CASERTA- CERVARO		TROIA	SOPPRESSIONE LOCALITA' DI SERVIZIO	
FORMIA-NAPOLI	J57/ 58	Campi Fl. - Mergellina	Rinnovamento binari con risanamento della massicciata (galleria Flegrea)	Ipo notturne rallentamento a 80 km/h
FORMIA-NAPOLI	J57/ 58	Sessa A.	costruzione rampa disabili marciapiede a servizio II° e III° binario	interruzione h24 binario di precedenza pari (III° binario) per costruzione rampa disabili

Principali interventi di manutenzione straordinaria

Attivazioni e/o trasformazioni impiantistiche

Linea comp.le	Codice Lin	Tratta / Località	Intervento / Indisponibilità	Note su fasi funzionali / Specifiche tecniche di circolazione
FORMIA-NAPOLI	J57/58	Minturno - Sessa A. e Cannello A. - Villa L.	Consolidamento impalcato ponti Km. 149+819, Km. 173+501 e Km. 152+380	INTERRUZIONI DI LINEA IN PERIODO NOTTURNO, DA COMPATIBILIZZARE CON GLI INTERVENTI PROGRAMMATI SULLA LINEA ROMA - CASSINO - NAPOLI e rallentamenti da compatibilizzare con gli interventi di rinnovo armamento tratta Minturno Sessa A. e semplificazione impianti tratta Casoria - Formia
FORMIA-NAPOLI	J57/58	Minturno - Sessa A.	Rinnovo armamento A.Q.	INTERRUZIONI DA PROGRAMMARE PER 4 NOTTI A SETTIMANA
FORMIA-NAPOLI	J57/58	stazioni di Minturno - Sessa A. - Frattamaggiore - Casoria	interventi di dismissione/sostituzione deviatori ambito semplificazione impianti	INTERRUZIONI DI LINEA IN PERIODO NOTTURNO, DA COMPATIBILIZZARE CON GLI INTERVENTI PROGRAMMATI SULLA LINEA ROMA - CASSINO - NAPOLI e rallentamenti da compatibilizzare con gli interventi di rinnovo armamento tratta Minturno Sessa A.
NAPOLI - BATTIPAGLIA	J57/58	NAPOLI S.GIOVANNI BARRA - TORRE ANNUNZIATA CENTRALE	Accordo Quadro T.E.	Interruzioni di linea in IPO notturne
CASSINO- NAPOLI	J61/62	VAIRANO - CAPUA	Rinnovo TE Accordo Quadro	Interruzioni di linea INTERRUZIONI DI LINEA IN PERIODO NOTTURNO, DA COMPATIBILIZZARE CON GLI INTERVENTI PROGRAMMATI SULLA LINEA ROMA - FORMIA - NAPOLI

Principali interventi di manutenzione straordinaria

Attivazioni e/o trasformazioni impiantistiche

Linea comp.le	Co dic e Lin	Tratta / Località	Intervento / Indisponibilità	Note su fasi funzionali / Specifiche tecniche di circolazione
NODO NAPOLI	R8	NAPOLI CENTRALE	realizzazione parcheggio multipiano	BINARIO DI CIRCOLAZIONE/ATTESTAMENTO [Limitazione di capacità dei binari 2÷4 (riduz. lungh. di 15 m) e binario 5 (riduz. lungh. di 210 m) per avvio lavori di realizzazione parcheggio multipiano]
VILLA LITERNO - NAPOLI GIANTURCO	J57/ 58	TRATTA CAMPI F.-NA GIANTURCO	MIGLIORAMENTO SICUREZZA IN GALLERIA	Interruzioni di linea in IPO notturne
FORMIA - NAPOLI	J57/ 58	VILLA LITERNO	Innalzamento marciapiedi 4° e 5°	Interruzione di un binario di circolazione per volta per 2 mesi cadauno
FORMIA - NAPOLI	J57/ 58	VILLA LITERNO	Innalzamento marciapiedi 1° , 2° e 3°	Interruzione di un binario di circolazione per volta per 2 mesi cadauno
NAPOLI - ROMA LINEA AV/AC		BIVIO ROMA SUD	Attivazione A.C.C./SCC/SCMT/ BAB LMV	6,30 ore P+D Contemporanea


Piani di attività trimestrali

2° TRIMESTRE 2013

Unità Territoriale

Napoli Nodo

Collegamento Nord-Sud

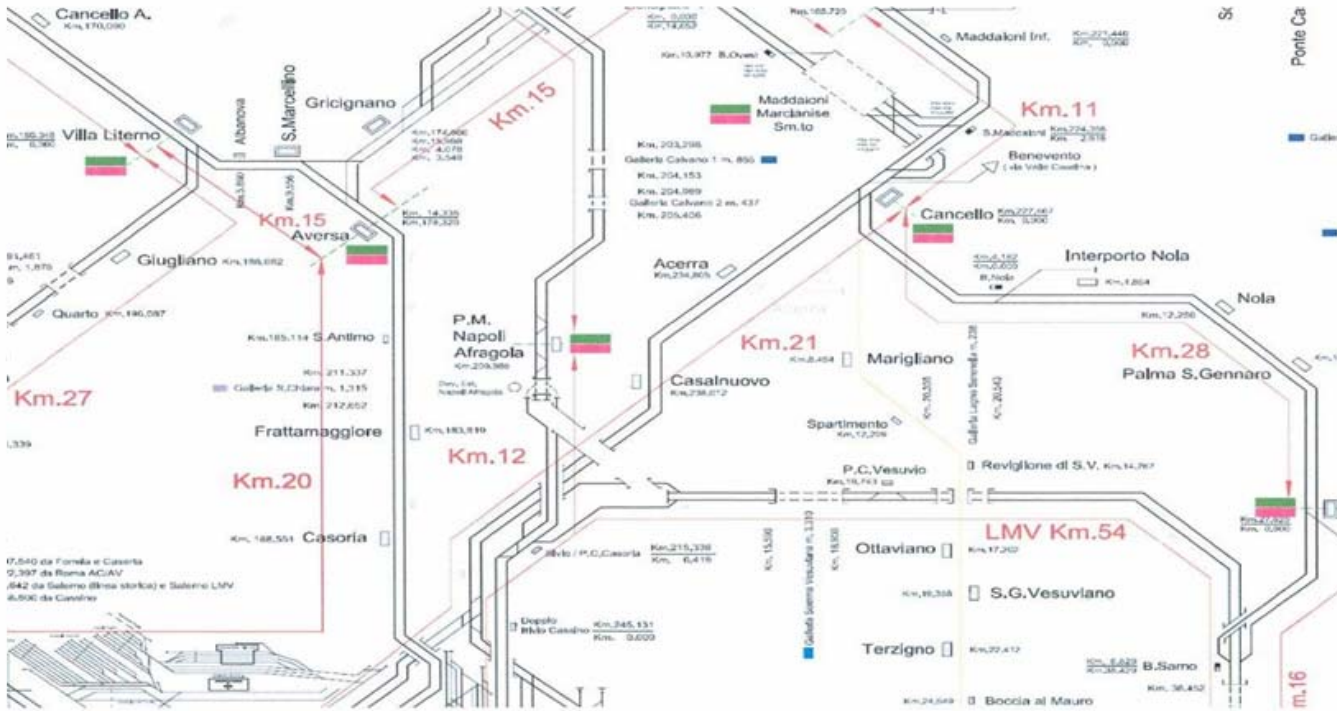

Il collegamento Bivio Roma Sud-Bivio Roma Nord:

- consentirà i collegamenti diretti Roma-Salerno evitando il passaggio e l'attestamento su Napoli Centrale.
- servirà da shunt per collegare la linea AV/AC con la linea Monte Vesuvio

Collegamento Nord Sud

Risorse	Lavoro (N/D)	Numero Settimana													
		aprile					maggio					giugno			
		14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	
NAM1LV24	N	1 x 5gg	1 x 5gg	1 x 5gg	1 x 5gg	1 x 5gg	1 x 5gg	1 x 5gg	1 x 5gg	1 x 5gg	1 x 5gg	1 x 5gg	1 x 5gg	1 x 5gg	
NAM1IS24	N	1 x 5gg	1 x 5gg	1 x 5gg	1 x 5gg	1 x 5gg	1 x 5gg	1 x 5gg	1 x 5gg	1 x 5gg	1 x 5gg	1 x 5gg	1 x 5gg	1 x 5gg	
NAM1TE24	N	1 x 5gg	1 x 5gg	1 x 5gg	1 x 5gg	1 x 5gg	1 x 5gg	1 x 5gg	1 x 5gg	1 x 5gg	1 x 5gg	1 x 5gg	1 x 5gg	1 x 5gg	
Interr. P/D	N	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	

Collegamento Nord Sud

- Come indicato nella tabella precedente gli impianti interessati al progetto **Collegamento Bivio Roma Nord-Bivio Roma Sud**, sono il tronco, la zona IS e la zona TE di Afragola.

Per una quota parte delle attività, e precisamente da inizio Maggio a fine Giugno, relativamente agli interventi da farsi in galleria Santa Chiara (stradelli e illuminazione per adeguamento vie di esodo), le interruzioni notturne avranno una durata di circa 8 ore e pertanto le prestazioni notturne dovranno essere programmate dalle ore 20.30 alle ore 5.30 per una durata massima di 9 ore. In queste condizioni la prestazione del mattino dovrà avere termine alle 12.30 per garantire le 8 ore minime di riposo.

Collegamento Nord Sud

- Inoltre, in relazione ai picchi d'impegno conseguenti alle attività di assistenza per il progetto di collegamento, dovranno essere prorogati i distacchi in Trasferimento Temporaneo già attivi dalla UT di Caserta alla zona IS di Afragola.

Varo/rimozione deviatoi Napoli Centrale




L'intervento, inserito nel contesto più ampio di trasformazione del piano regolatore generale di Napoli Centrale, consentirà, entro il 2015 di avere un dispositivo d'armamento più moderno e sicuro.

Su esso, inoltre, sarà implementato il nuovo ACC di Napoli Centrale.

Varo/rimozione deviatoi Napoli Centrale

Risorse	Lavoro (N/D)	Numero Settimana												
		aprile					maggio				giugno			
		14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
NAM1LV03	N	2 x 3gg	2 x 3gg	2 x 3gg	2 x 3gg	2 x 3gg	2 x 3gg	2 x 3gg	2 x 3gg	2 x 3gg	2 x 3gg	2 x 3gg	2 x 3gg	2 x 3gg
NAM1IS03	N	2 x 1gg	2 x 1gg	2 x 1gg	2 x 1gg	2 x 1gg	2 x 1gg	2 x 1gg	2 x 1gg	2 x 1gg	2 x 1gg	2 x 1gg	2 x 1gg	2 x 1gg
NAM1TE03	N	2 x 2gg	2 x 2gg	2 x 2gg	2 x 2gg	2 x 2gg	2 x 2gg	2 x 2gg	2 x 2gg	2 x 2gg	2 x 2gg	2 x 2gg	2 x 2gg	2 x 2gg
Interr. Bin. Staz.	N	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3

Binari Napoli Centrale

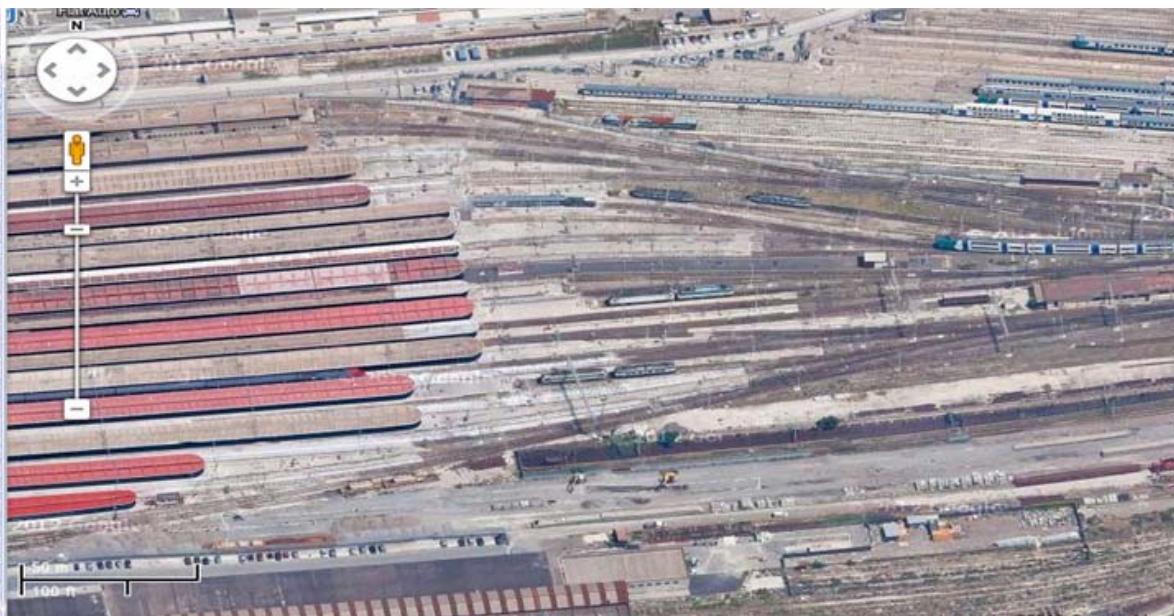

- velocizzazione itinerari binari 17 (arrivi) e 18 (partenze)
- banalizzazione binari stazione elementare AV (16 a 19)

Anche quest'intervento, legato alla più ampia di trasformazione del piano regolatore generale di Napoli Centrale, consentirà entro l'anno in corso, di innalzare la velocità di ingresso e uscita da Napoli Centrale da 30km/h a 60km/h su tutti i binari dedicati (16,17,18 e 19).

Binari Napoli Centrale

Risorse	Lavoro (N/D)	Numero Settimana												
		aprile					maggio				giugno			
		14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
NAM1LV03	N	3 x 5gg	3 x 5gg	3 x 5gg	3 x 5gg	3 x 5gg	3 x 5gg	3 x 5gg	3 x 5gg	3 x 5gg	3 x 5gg	3 x 5gg	3 x 5gg	3 x 5gg
NAM1IS03	N	2 x 5gg	2 x 5gg	2 x 5gg	2 x 5gg	2 x 5gg	2 x 5gg	2 x 5gg	2 x 5gg	2 x 5gg	2 x 5gg	2 x 5gg	2 x 5gg	2 x 5gg
NAM1TE03	N	2 x 5gg	2 x 5gg	2 x 5gg	2 x 5gg	2 x 5gg	2 x 5gg	2 x 5gg	2 x 5gg	2 x 5gg	2 x 5gg	2 x 5gg	2 x 5gg	2 x 5gg
Interr. Bin. Staz.	N	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5

Minturno e Sessa

Rinnovo binari e contemporaneo risanamento massicciata (binario pari)



Minturno e Sessa

Rinnovo binari e contemporaneo risanamento massicciata (binario pari)

Risorse	Lavoro (N/D)	Numero Settimana												
		aprile					maggio				giugno			
		14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
NAM1LV08	N	3 x 4gg	3 x 4gg	3 x 4gg	3 x 4gg	3 x 4gg	3 x 4gg	3 x 4gg	3 x 4gg	3 x 4gg	3 x 4gg	3 x 4gg	3 x 4gg	3 x 4gg
NAM1IS06	N	2 x 4gg	2 x 4gg	2 x 4gg	2 x 4gg	2 x 4gg	2 x 4gg	2 x 4gg	2 x 4gg	2 x 4gg	2 x 4gg	2 x 4gg	2 x 4gg	2 x 4gg
NAM1TE07	N	2 x 4gg	2 x 4gg	2 x 4gg	2 x 4gg	2 x 4gg	2 x 4gg	2 x 4gg	2 x 4gg	2 x 4gg	2 x 4gg	2 x 4gg	2 x 4gg	2 x 4gg
Interr. P/D	N	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4

Minturno e Sessa

Rinnovo binari e contemporaneo risanamento massicciata (binario pari).

Per i picchi d'impegno legati a tale intervento è previsto, al fine di non superare i limiti contrattuali relativi al numero di notti massime settimanali e mensili, il supporto degli impianti limitrofi quali Villa Literno, Campi Flegrei e Aversa.

PJ Gricignano - Bv. Casoria

Rinnovo/posa cavi e cementificazione cavidotti



PJ Gricignano - Bv. Casoria

Risorse	Lavoro (N/D)	Numero Settimana												
		aprile					maggio				giugno			
		14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
NAM1IS24	N	1 x 5gg	1 x 5gg	1 x 5gg	1 x 5gg	1 x 5gg	2 x 5gg	2 x 5gg	2 x 5gg	2 x 5gg	2 x 5gg	2 x 5gg	2 x 5gg	2 x 5gg
NAM1TE24	N	1 x 5gg	1 x 5gg	1 x 5gg	1 x 5gg	1 x 5gg	1 x 5gg	1 x 5gg	1 x 5gg	1 x 5gg	1 x 5gg	1 x 5gg	1 x 5gg	1 x 5gg
Interr. P/D	N	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5

Galleria del Massico

Miglioramento della sicurezza dal km 161+235 al km 155+855



Galleria del Massico

I progetti di miglioramento in galleria che sono in corso presso la nostra Direzione riguardano la **Galleria Santa Lucia** (UT Sud Est Salerno) e la **Galleria del Massico** (UT Napoli Nodo).

Entrambi gli interventi prevedono la messa in sicurezza ai sensi del DM del 28 ottobre 2005; saranno realizzati impianti antincendio, impianti di illuminazione, impianti di sicurezza, realizzate migliori vie di esodo; sarà pertanto elevato la standard di sicurezza sia per eventuali viaggiatori sia per i lavoratori di RFI.


Galleria del Massico

Risorse	Lavoro (N/D)	Numero Settimana												
		aprile					maggio					giugno		
		14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
NAM1LV08	N	1 x 3gg	1 x 3gg	1 x 3gg	1 x 3gg	1 x 3gg	1 x 3gg	1 x 3gg	1 x 3gg	1 x 3gg				
NAM1TE07	N	1 x 3gg	1 x 3gg	1 x 3gg	1 x 3gg	1 x 3gg	1 x 3gg	1 x 3gg	1 x 3gg	1 x 3gg				
Interr. P/D	N	3	3	3	3	3	3	3	3	3				

Frattamaggiore

Rinnovo/eliminazione deviatoi presso la stazione

L'intervento prevede l'eliminazione di n° 7 deviatoi posti sui binari di corsa con trasformazione di Frattameggiore in fermata; anche questa modifica avrà come impatto immediato una diminuzione del carico di lavoro per RFI.



Frattamaggiore

Risorse	Lavoro (N/D)	Numero Settimana											
		aprile					maggio				giugno		
		14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
NAM1LV06	N		3 x 3gg	3 x 3gg	3 x 3gg	3 x 3gg							
NAM1IS05	N		2 x 1gg	2 x 1gg	2 x 1gg	2 x 1gg							
NAM1TE05	N		2 x 2gg	2 x 2gg	2 x 2gg	2 x 2gg							
Interr. P/D	N		3	3	3	3							

Unità Territoriale Sud Est Salerno

S. Giovanni Barra-Torre C. Le

- Rinnovo della linea di contatto




S. Giovanni Barra-Torre C. Le

- Rinnovo della linea di contatto

Risorse	Lavoro (N/D)	Numero Settimana												
		Aprile					Maggio				Giugno			
		14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
NAM2TE09	N	3 x 5gg	3 x 5gg	3 x 5gg	3 x 5gg	3 x 5gg	3 x 5gg	3 x 5gg	3 x 5gg	3 x 5gg	3 x 5gg	3 x 5gg	3 x 5gg	3 x 5gg
NAM2LV10	N		1 x 5gg	1 x 5gg	1 x 5gg	1 x 5gg	1 x 5gg	1 x 5gg	1 x 5gg	1 x 5gg	1 x 5gg			
Interr. P/D	N	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5


Scafati, Angri, Nocera Inferiore

- Lavori di Armamento MSA rightsizing di Scafati:

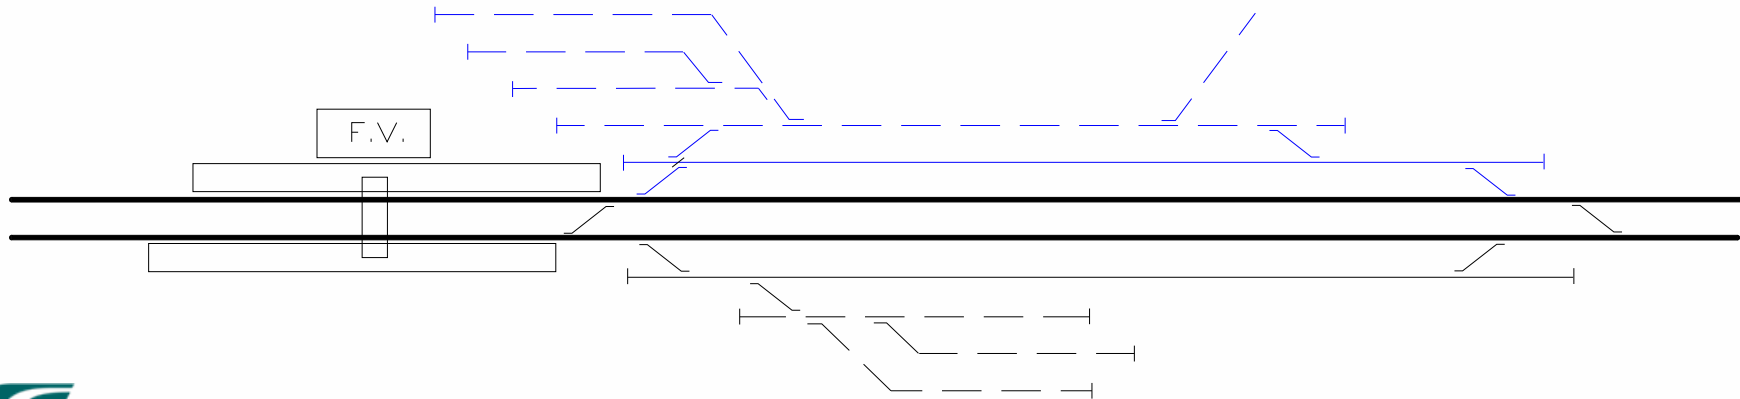


Scafati, Angri, Nocera Inferiore

- Lavori di Armamento MSA rightsizing di Angri:



Scafati, Angri, Nocera Inferiore

- Lavori di Armamento MSA rightsizing di Nocera Inferiore:

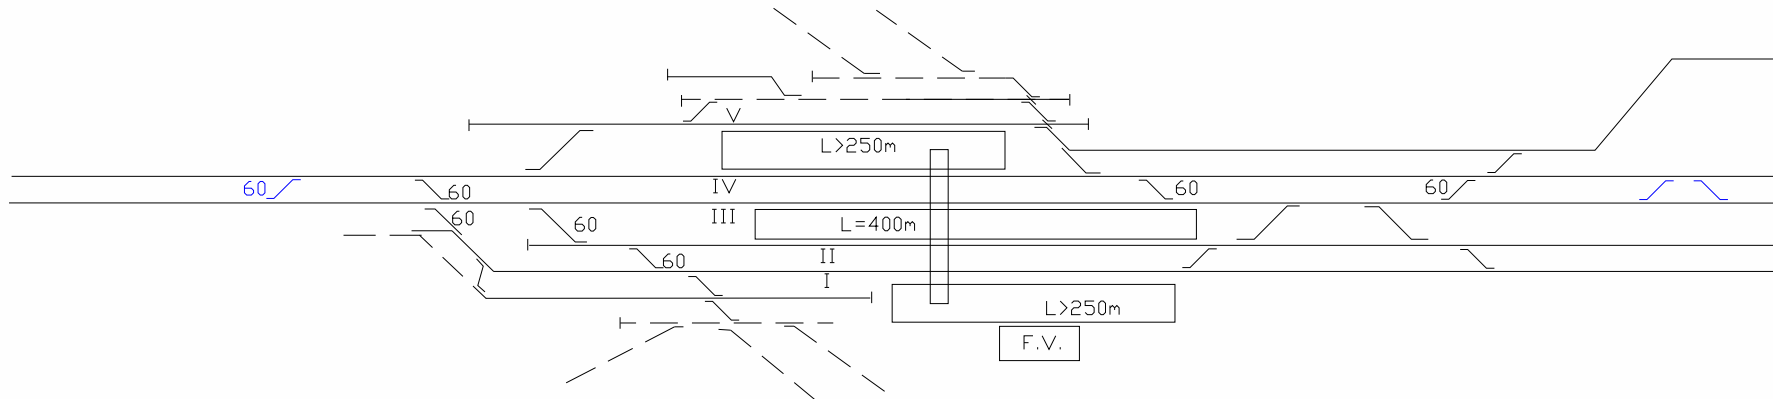

Scafati, Angri, Nocera Inferiore

Lavori di Armamento MSA rightsizing

Risorse	Lavoro (N/D)	Numero Settimana												
		Aprile					Maggio				Giugno			
		14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
NAM2LV11	N		3 x 5gg	3 x 5gg	3 x 5gg	3 x 5gg	3 x 5gg	3 x 5gg	3 x 5gg	3 x 5gg	3 x 5gg			
NAM2TE09	N		1 x 5gg	1 x 5gg	1 x 5gg	1 x 5gg	1 x 5gg	1 x 5gg	1 x 5gg	1 x 5gg	1 x 5gg			
Interr. Bin. Staz.	N		5	5	5	5	5	5	5	5	5			

Galleria Santa Lucia

- Messa in sicurezza Galleria

Risorse	Lavoro (N/D)	Numero Settimana												
		Aprile					Maggio				Giugno			
		14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
NAM2LV13	N	1 x 5gg	1 x 5gg	1 x 5gg	1 x 5gg	1 x 5gg	1 x 5gg	1 x 5gg	1 x 5gg	1 x 5gg	1 x 5gg	1 x 5gg	1 x 5gg	1 x 5gg
NAM2TE12	N	1 x 5gg	1 x 5gg	1 x 5gg	1 x 5gg	1 x 5gg	1 x 5gg	1 x 5gg	1 x 5gg	1 x 5gg	1 x 5gg	1 x 5gg	1 x 5gg	1 x 5gg
NAM2TE14	N	1 x 5gg	1 x 5gg	1 x 5gg	1 x 5gg	1 x 5gg	1 x 5gg	1 x 5gg	1 x 5gg	1 x 5gg	1 x 5gg	1 x 5gg	1 x 5gg	1 x 5gg
Interr. Bin. Staz.	N	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5

Galleria Santa Lucia

- **Messa in sicurezza Galleria Santa Lucia**

*I progetti di miglioramento in galleria che sono in corso presso la nostra Direzione riguardano la **Galleria Santa Lucia** (UT Sud Est Salerno) e la **Galleria del Massico** (UT Napoli Nodo). Entrambi gli interventi prevedono la messa in sicurezza ai sensi del DM del 28 ottobre 2005; saranno realizzati impianti antincendio, impianti di illuminazione, impianti di sicurezza, realizzate migliori vie di esodo; sarà pertanto elevato la standard di sicurezza sia per eventuali viaggiatori sia per i lavoratori di RFI.*



Pontecagnano

- Lavori di risanamento PL km 64+366 a Pontecagnano.



Principali interventi di manutenzione straordinaria

- Lavori di risanamento PL km 64+366 a Pontecagnano

Risorse	Lavoro (N/D)	Numero Settimana											
		Aprile					Maggio				Giugno		
		14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
NAM2LV13	N		2 x 2gg										
NAM2TE14	N		1 x 2gg										
Interr. P/D	N		2										

Salerno

- **Copertura trincerone ferroviario Comune di Salerno.**
La realizzazione dell'opera, in collaborazione con il Comune di Salerno, prevede la creazione di un'area, che funge da copertura della linea ferroviaria, da adibire a verde pubblico e parcheggio.



Salerno

- Copertura trincerone ferroviario Comune di Salerno

Risorse	Lavoro (N/D)	Numero Settimana													
		Aprile					Maggio				Giugno				
		14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	
NAM2LV13	N	1 x 5gg	1 x 1gg												
NAM2TE12	N	1 x 5gg	1 x 1gg												
Interr. P/D	N	5	1												

Salerno

- Lavori di realizzazione sottovia al km 53 stazione di Salerno conto Comune di Salerno.

Lavoro (N/D)	Numero Settimana												
	Aprile					Maggio				Giugno			
	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
N						3 x 3gg							
N						2 x 3gg							
N						3 x 1gg							
N						3							

Pontecagnano e Battipaglia

- Rinnovo deviatoi 1a e 1b e demolizione deviatoi 2a e 2b a Pontecagnano nonché rinnovo deviatoio 22 a Battipaglia



Pontecagnano e Battipaglia

- Rinnovo deviatoi 1a e 1b e demolizione deviatoi 2a e 2b a Pontecagnano nonché rinnovo deviatoio 22 a Battipaglia

Risorse	Lavoro (N/D)	Numero Settimana											
		Aprile					Maggio				Giugno		
		14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
NAM2LV13	N	2 x 3gg	2 x 3gg	2 x 3gg	2 x 3gg								
NAM2LV14	N	1 x 3gg	1 x 3gg	1 x 3gg	1 x 3gg		4 x 3gg						
NAM2TE12	N	1 x 3gg	1 x 3gg	1 x 1gg			2 x 3gg						
NAM2IS12	N	4 x 1gg	4 x 1gg				4 x 1gg						
NAM2TE14	N	3 x 1gg	3 x 1gg	2 x 1gg	2 x 1gg		2 x 2gg						
Interr. P/D	N	3	3	3	3		3						

PC Vesuvio-Bivio Santa Lucia

- Manutenzione TE ordinaria e straordinaria tratta PC Vesuvio-Bivio Santa Lucia

Risorse	Lavoro (N/D)	Numero Settimana												
		Aprile					Maggio				Giugno			
		14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
NAM2TE11	N	3 x 2gg	3 x 2gg	3 x 2gg	3 x 2gg	3 x 2gg	3 x 2gg	3 x 2gg	3 x 2gg	3 x 2gg	3 x 2gg	3 x 2gg	3 x 2gg	3 x 2gg
	N													
	N													
Interr. P/D	N	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2


Principali interventi di manutenzione straordinaria

- Lavori MSA ricambio traverse 1 e 2 binario stazione di Salerno

Risorse	Lavoro (N/D)	Numero Settimana													
		Aprile					Maggio				Giugno				
		14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	
NAM2LV13	N		1 x 5gg	1 x 5gg	1 x 5gg	1 x 5gg	1 x 5gg	1 x 5gg	1 x 5gg	1 x 5gg	1 x 5gg				
NAM2LV14	N		2 x 5gg	2 x 5gg	2 x 5gg	2 x 5gg	2 x 5gg	2 x 5gg	2 x 5gg	2 x 5gg	2 x 5gg				
NAM2TE14	N		1 x 5gg	1 x 5gg	1 x 5gg	1 x 5gg	1 x 5gg	1 x 5gg	1 x 5gg	1 x 5gg	1 x 5gg				
NAM2IS12	N		2 x 3gg	2 x 3gg	2 x 3gg	2 x 3gg	2 x 3gg	2 x 3gg	2 x 3gg	2 x 3gg	2 x 3gg				
NAM2TE12	N		1 x 5gg	1 x 5gg	1 x 5gg	1 x 5gg	1 x 5gg	1 x 5gg	1 x 5gg	1 x 5gg	1 x 5gg				
Interr. P/D	N		5	5	5	5	5	5	5	5	5				

Linea a Monte del Vesuvio

- Lavori di realizzazione GSMR sulla LMV – ITALFERR

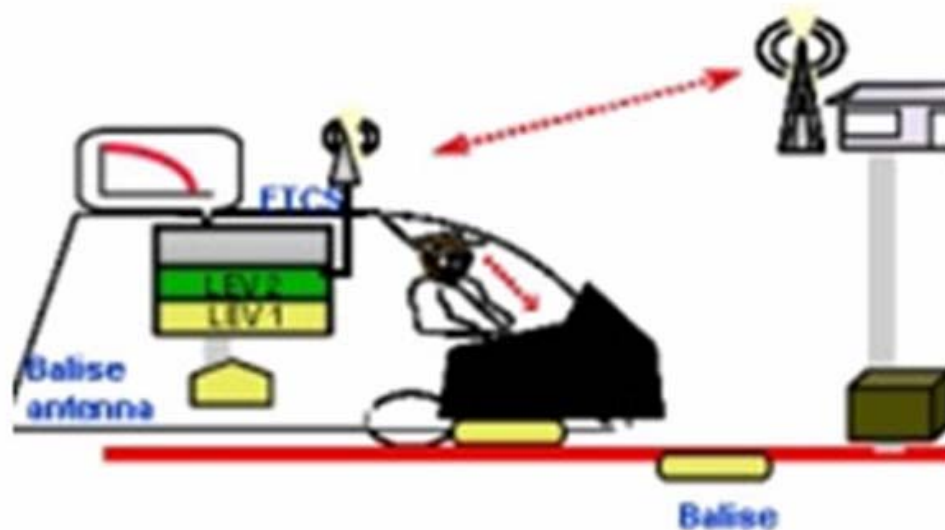

Linea a Monte del Vesuvio

- Lavori di realizzazione GSMR sulla LMV –ITALFERR

Risorse	Lavoro (N/D)	Numero Settimana											
		Aprile					Maggio				Giugno		
		14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
NAM2TE11	N	1 x 3gg	1 x 3gg	1 x 3gg	1 x 3gg	1 x 3gg	1 x 3gg	1 x 3gg	1 x 3gg	1 x 3gg	1 x 3gg	1 x 3gg	1 x 3gg
NAM2LV12		1 x 3gg	1 x 3gg	1 x 3gg	1 x 3gg	1 x 3gg	1 x 3gg	1 x 3gg	1 x 3gg	1 x 3gg	1 x 3gg	1 x 3gg	1 x 3gg
Interr. P/D	N	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3

Principali interventi di manutenzione straordinaria

Unità Territoriale
Nord Est Caserta

VAIRANO-CAPUA

- RINNOVO TE VAIRANO-CAPUA



VAIRANO-CAPUA

- RINNOVO TE

Risorse	Lavoro (N/D)	Numero Settimana												Note	
		Aprile					Maggio				Giugno				
		14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25		26
NAM3TE08	D	2 x 4gg	2 x 5gg	2 x 5gg	2 x 4gg	2 x 4gg	2 x 5gg	2 x 5gg	2 x 5gg	2 x 5gg	2 x 5gg	2 x 5gg	2 x 5gg	2 x 5gg	
Interr. P/D	D	4	5	5	4	4	5	5	5	5	5	5	5	5	
NAM3TE16	D	2 x 4gg	2 x 5gg	2 x 5gg	2 x 4gg	2 x 4gg	2 x 5gg	2 x 5gg	2 x 5gg	2 x 5gg	2 x 5gg	2 x 5gg	2 x 5gg	2 x 5gg	
Interr. P/D	D	4	5	5	4	4	5	5	5	5	5	5	5	5	

Caserta

- Risanamento tratti saltuari 1° e 2° binario in stazione di CASERTA (MSA)

Risorse	Lavoro (N/D)	Numero Settimana											
		Aprile					Maggio				Giugno		
		14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
NAM3LV22	D	4 x 4gg	4 x 5gg										
NAM3IS23	D	2 x 1gg	2 x 1gg										
NAM3TE02	D	1 x 4gg	1 x 5gg										
Interr. P/D	D	4	5										

Caserta-Cassino

- Sostituzione tratti di cavi in basso isolamento e blindatura tra Caserta e Cassino, C.A.n.31 del 23/7/2012 AQ 36/200

Risorse	Lavoro (N/D)	Numero Settimana												
		Aprile					Maggio				Giugno			
		14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
NAM3TE08	D	2 x 4gg	2 x 5gg	2 x 5gg	2 x 4gg	2 x 4gg	2 x 5gg	2 x 5gg	2 x 5gg	2 x 5gg	2 x 5gg			
NAM3IS22	D	1 x 4gg	1 x 5gg	1 x 5gg	1 x 4gg	1 x 4gg	1 x 5gg	1 x 5gg	1 x 5gg	1 x 5gg	1 x 5gg			
Interr. P/D	D	4	5	5	4	4	5	5	5	5	5			

VAIRANO-MIGNANO

- RINNOVO ARMAMENTO VAIRANO-MIGNANO



VAIRANO-MIGNANO

- RINNOVO ARMAMENTO VAIRANO-MIGNANO

Risorse	Lavoro (N/D)	Numero Settimana												
		Aprile					Maggio				Giugno			
		14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
NAM3LV04	D	4 x 4gg	4 x 5gg	4 x 5gg	4 x 4gg	4 x 4gg	4 x 5gg	4 x 5gg	4 x 5gg	4 x 5gg				
NAM3IS22	D	2 x 4gg	2 x 5gg	2 x 5gg	2 x 4gg	2 x 4gg	2 x 5gg	2 x 5gg	2 x 5gg	2 x 5gg				
NAM3TE08	D	2 x 4gg	2 x 5gg	2 x 5gg	2 x 4gg	2 x 4gg	2 x 5gg	2 x 5gg	2 x 5gg	2 x 5gg				
Interr. P/D	D	4	5	5	4	4	5	5	5	5				

Sparanise-Secondo Bivio Caserta

- Sostituzione traverse (n.5000) con risanamento:
SPARANISE-2°B°CE N. (MSA)

Risorse	Lavoro (N/D)	Numero Settimana												
		Aprile					Maggio				Giugno			
		14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
NAM3LV2 3	N										2 x 5gg	2 x 5gg	2 x 5gg	2 x 5gg
NAM3IS20	N										2 x 5gg	2 x 5gg	2 x 5gg	2 x 5gg
NAM3TE1 6	N										2 x 5gg	2 x 5gg	2 x 5gg	2 x 5gg
NAM3LV2 2	N										2 x 5gg	2 x 5gg	2 x 5gg	2 x 5gg
NAM3IS23	N										2 x 5gg	2 x 5gg	2 x 5gg	2 x 5gg
NAM3TE0 2	N										2 x 5gg	2 x 5gg	2 x 5gg	2 x 5gg
Interr. P/D	N										5	5	5	5

Venafro

- Lavori al Posto Sezionamento Amperometrico di Venafro



Venafro

- Lavori al Posto Sezionamento Amperometrico di Venafro

Risorse	Lavoro (N/D)	Numero Settimana											
		Aprile					Maggio				Giugno		
		14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
NAM3TE16	D	2 x 4gg	2 x 5gg										
Interr. P/D	D	4	5										

Sparanise

- Rinnovo due deviatori 1a e 2a in stazione di SPARANISE (MSA)

Risorse	Lavoro (N/D)	Numero Settimana											
		Aprile					Maggio				Giugno		
		14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
NAM3LV23	N						2 x 5gg	2 x 5gg					
NAM3IS20	N						1 x 5gg	1 x 5gg					
NAM3TE16	N						1 x 5gg	1 x 5gg					
Interr. P/D	N						5	5					

Caserta

- Rinnovo 4+2 deviatori in stazione di CASERTA(CM):18a, 106a, 6b/5, 4b/3;.12A/13B-29B/30°



Caserta

- Rinnovo 4+2 deviatori in stazione di CASERTA(CM):18a, 106a, 6b/5, 4b/3;.12A/13B-29B/30°

Risorse	Lavoro (N/D)	Numero Settimana													
		Aprile					Maggio				Giugno				
		14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	
NAM3LV22	N							2 x 5gg	2 x 5gg	2 x 5gg	2 x 5gg	2 x 5gg	2 x 5gg		
NAM3IS23	N							1 x 5gg	1 x 5gg	1 x 5gg	1 x 5gg	1 x 5gg	1 x 5gg		
NAM3TE02	N							1 x 5gg	1 x 5gg	1 x 5gg	1 x 5gg	1 x 5gg	1 x 5gg		
Interr. P/D	N							5	5	5	5	5	5		

Pignataro

- Stazione di Pignataro -Realizzazione di un nuovo sottopasso pedonale.

Risorse	Lavoro (N/D)	Numero Settimana												
		Aprile					Maggio				Giugno			
		14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
NAM3LV23	N										1 x 5gg	1 x 5gg	1 x 5gg	1 x 5gg
NAM3IS20	N										1 x 2gg		1 x 2gg	
NAM3TE16	N										2 x 2gg		2 x 2gg	
Interr. P/D	N										5	5	5	5

Capua

- Stazione di Capua: Realizzazione di un nuovo sottopasso pedonale

Lavoro (N/D)	Numero Settimana												
	Aprile					Maggio				Giugno			
	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
D	1 x 4gg	1 x 5gg	1 x 5gg	1 x 4gg	1 x 4gg								
D	1 x 1gg	1 x 1gg	1 x 1gg	1 x 1gg	1 x 1gg								
D	4	5	5	4	4								

Linea AV/AC

- Rilevati cedevoli Bin Pari linea AV/AC.

Risorse	Lavoro (N/D)	Numero Settimana												
		Aprile					Maggio				Giugno			
		14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
NAM3LV22	N	5 x 4gg	5 x 5gg	5 x 5gg	5 x 4gg	5 x 4gg	5 x 4gg	5 x 4gg	5 x 4gg	5 x 4gg				
NAM3IS23	N	2 x 4gg	2 x 5gg	2 x 5gg	2 x 4gg	2 x 4gg	2 x 4gg	2 x 4gg	2 x 4gg	2 x 4gg				
NAM3TE02	N	2 x 4gg	2 x 5gg	2 x 5gg	2 x 4gg	2 x 4gg	2 x 4gg	2 x 4gg	2 x 4gg	2 x 4gg				
Interr. P/D	N	4	5	5	4	4	4	4	4	4				

Tratte varie

- Molatura rotaie



Tratte varie

- Molatura rotaie

Risorse	Lavoro (N/D)	Numero Settimana											
		Aprile					Maggio				Giugno		
		14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
NAM3LV22	N					5 x 4gg	2 x 5gg						
NAM3LV23	N			2 x 5gg	2 x 4gg								
NAM3LV04	N	2 x 4gg	2 x 5gg										
NAM3IS23	N						3 x 1gg						
NAM3IS20	N			3 x 1gg									
NAM3IS22	N		3 x 1gg										
Interr. P/D	N	4	5	5	4	4	5						

PC Pignataro

- Sistema rilevamento caduta veicoli "SIRIO"

Lavoro (N/D)	Numero Settimana												
	Aprile					Maggio				Giugno			
	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
N											2 x 5gg	2 x 5gg	2 x 5gg
N												2 x 5gg	2 x 5gg
N											5	5	5

PC Pignataro

- Sistema rilevamento caduta veicoli "SIRIO"
- Il sistema SIRIO è un sistema di rilevamento in grado di percepire la presenza / caduta di veicoli o gli ostacoli in genere in linea e attivare i sistema di sicurezza relativi.

Cervaro-Bovino

- Raddoppio Cervaro-Bovino

Risorse	Lavoro (N/D)	Numero Settimana												
		Aprile					Maggio				Giugno			
		14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
NAM3LV21	N	1 x 3gg	1 x 4gg	1 x 4gg	1 x 3gg	1 x 3gg	1 x 4gg	1 x 4gg	1 x 4gg	1 x 4gg	1 x 4gg	1 x 4gg	1 x 4gg	1 x 4gg
NAM3TE18	N	2 x 3gg	2 x 4gg	2 x 4gg	2 x 3gg	2 x 3gg	2 x 4gg	2 x 4gg	2 x 4gg	2 x 4gg	2 x 4gg	2 x 4gg	2 x 4gg	2 x 4gg
Interr. P/D	N	3	4	4	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4

Pianerottolo; Paduli; Benevento; Savignano

- DOWN SIZING: VARIE STAZIONI Pianerottolo; Paduli; Benevento; Savignano

Risorse	Lavoro (N/D)	Numero Settimana												
		Aprile					Maggio				Giugno			
		14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
NAM3LV18	N							3 x 4gg	3 x 4gg	3 x 4gg				
NAM3LV21	N	3 x 3gg	3 x 3gg	3 x 3gg	3 x 3gg	3 x 2gg	3 x 3gg					3 x 3gg	3 x 3gg	3 x 3gg
NAM3IS15	N	2 x 3gg	2 x 3gg	2 x 3gg	2 x 3gg	2 x 2gg	2 x 3gg	2 x 4gg	2 x 4gg	2 x 4gg				
NAM3IS17	N							2 x 4gg	2 x 4gg	2 x 4gg				
NAM3IS19	N	2 x 3gg	2 x 3gg	2 x 3gg	2 x 3gg	2 x 2gg	2 x 3gg							
NAM3TE15	N							2 x 4gg	2 x 4gg	2 x 4gg				
NAM3TE18	N	2 x 3gg	2 x 3gg	2 x 3gg	2 x 3gg	2 x 2gg	2 x 3gg	2 x 4gg	2 x 4gg	2 x 4gg		2 x 3gg	2 x 3gg	2 x 3gg
Interr. P/D	N	3	3	3	3	2	3	4	4	4		3	3	3

Galleria Colle Limata Caserta-Benevento

- Risanamento massicciata galleria Colle Limata

Risorse	Lavoro (N/D)	Numero Settimana												
		Aprile					Maggio				Giugno			
		14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
NAM3LV16	N										3 x 4gg	3 x 4gg	3 x 4gg	3 x 4gg
NAM3TE15	N										2 x 4gg	2 x 4gg	2 x 4gg	2 x 4gg
Interr. P/D	N										4	4	4	4

WBS	Descrizione	Linea (piano attività)	Tratta	Risorse	Lavoro (N/D)	Numero Settimana																Note	
						aprile					maggio				giugno								
						14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26					
	Progetto collegamento Nord-Sud - Varo Deviato	Roma - Napoli (AV/AC)	Bv. Roma Sud	NAMHLV24	N	1 x 5gg	1 x 5gg	1 x 5gg	1 x 5gg	1 x 5gg	1 x 5gg	1 x 5gg	1 x 5gg	1 x 5gg	1 x 5gg	1 x 5gg	1 x 5gg	1 x 5gg	1 x 5gg				
				NAMIS24	N	1 x 5gg	1 x 5gg	1 x 5gg	1 x 5gg	1 x 5gg	1 x 5gg	1 x 5gg	1 x 5gg	1 x 5gg	1 x 5gg	1 x 5gg	1 x 5gg	1 x 5gg	1 x 5gg	1 x 5gg			
				NAMITE24	N	1 x 5gg	1 x 5gg	1 x 5gg	1 x 5gg	1 x 5gg	1 x 5gg	1 x 5gg	1 x 5gg	1 x 5gg	1 x 5gg	1 x 5gg	1 x 5gg	1 x 5gg	1 x 5gg	1 x 5gg	1 x 5gg		
				Interr. P/D	N	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5		
0512A2013-1002	Varo/rimozione deviatori	Nodo di Napoli	Napoli C.le	NAMHLV03	N	2 x 3gg	2 x 3gg	2 x 3gg	2 x 3gg	2 x 3gg	2 x 3gg	2 x 3gg	2 x 3gg	2 x 3gg	2 x 3gg	2 x 3gg	2 x 3gg	2 x 3gg	2 x 3gg	2 x 3gg			
				NAMIS03	N	2 x 1gg	2 x 1gg	2 x 1gg	2 x 1gg	2 x 1gg	2 x 1gg	2 x 1gg	2 x 1gg	2 x 1gg	2 x 1gg	2 x 1gg	2 x 1gg	2 x 1gg	2 x 1gg	2 x 1gg	2 x 1gg		
				NAMITE03	N	2 x 2gg	2 x 2gg	2 x 2gg	2 x 2gg	2 x 2gg	2 x 2gg	2 x 2gg	2 x 2gg	2 x 2gg	2 x 2gg	2 x 2gg	2 x 2gg	2 x 2gg	2 x 2gg	2 x 2gg	2 x 2gg	2 x 2gg	
				Interr. Bin. Staz.	N	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	
1637-S01-RE-F01	Velocizzazione itinerari binari 17 (arrivi) e 18 (partenze) a Napoli C.le e banalizzazione binari stazione elementare AV di Napoli C.le (16 a 19)	Nodo di Napoli	Napoli C.le	NAMHLV03	N	3 x 5gg	3 x 5gg	3 x 5gg	3 x 5gg	3 x 5gg	3 x 5gg	3 x 5gg	3 x 5gg	3 x 5gg	3 x 5gg	3 x 5gg	3 x 5gg	3 x 5gg	3 x 5gg	3 x 5gg			
				NAMIS03	N	2 x 5gg	2 x 5gg	2 x 5gg	2 x 5gg	2 x 5gg	2 x 5gg	2 x 5gg	2 x 5gg	2 x 5gg	2 x 5gg	2 x 5gg	2 x 5gg	2 x 5gg	2 x 5gg	2 x 5gg	2 x 5gg		
				NAMITE03	N	2 x 5gg	2 x 5gg	2 x 5gg	2 x 5gg	2 x 5gg	2 x 5gg	2 x 5gg	2 x 5gg	2 x 5gg	2 x 5gg	2 x 5gg	2 x 5gg	2 x 5gg	2 x 5gg	2 x 5gg	2 x 5gg	2 x 5gg	
				Interr. Bin. Staz.	N	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	
0512A2013-1001	Rinnovo binari e contemporaneo risanamento massicciata	Roma - Napoli (via Formia)	Minturno - Sessa Aurunca	NAMHLV08	N	3 x 4gg	3 x 4gg	3 x 4gg	3 x 4gg	3 x 4gg	3 x 4gg	3 x 4gg	3 x 4gg	3 x 4gg	3 x 4gg	3 x 4gg	3 x 4gg	3 x 4gg	3 x 4gg	3 x 4gg			
				NAMIS06	N	2 x 4gg	2 x 4gg	2 x 4gg	2 x 4gg	2 x 4gg	2 x 4gg	2 x 4gg	2 x 4gg	2 x 4gg	2 x 4gg	2 x 4gg	2 x 4gg	2 x 4gg	2 x 4gg	2 x 4gg	2 x 4gg		
				NAMITE07	N	2 x 4gg	2 x 4gg	2 x 4gg	2 x 4gg	2 x 4gg	2 x 4gg	2 x 4gg	2 x 4gg	2 x 4gg	2 x 4gg	2 x 4gg	2 x 4gg	2 x 4gg	2 x 4gg	2 x 4gg	2 x 4gg	2 x 4gg	
				Interr. P/D	N	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
0512A2013-1008	Rinnovo/posa cavi e cementificazione cavidotti	Roma - Napoli (AV/AC)	PJ Gricignano - Bv. Casoria	NAMIS24	N	1 x 5gg	1 x 5gg	1 x 5gg	1 x 5gg	1 x 5gg	2 x 5gg	2 x 5gg	2 x 5gg	2 x 5gg	2 x 5gg	2 x 5gg	2 x 5gg	2 x 5gg	2 x 5gg	2 x 5gg			
				NAMITE24	N	1 x 5gg	1 x 5gg	1 x 5gg	1 x 5gg	1 x 5gg	1 x 5gg	1 x 5gg	1 x 5gg	1 x 5gg	1 x 5gg	1 x 5gg	1 x 5gg	1 x 5gg	1 x 5gg	1 x 5gg	1 x 5gg	1 x 5gg	
				Interr. P/D	N	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	
1275A2005-1001	Miglioramento della sicurezza della Galleria del Massico dal km 161+235 al km 155+855	Roma - Napoli (via Formia)	Falciano - Sessa Aurunca	NAMHLV08	N	1 x 3gg	1 x 3gg	1 x 3gg	1 x 3gg	1 x 3gg	1 x 3gg	1 x 3gg	1 x 3gg	1 x 3gg	1 x 3gg								
				NAMITE07	N	1 x 3gg	1 x 3gg	1 x 3gg	1 x 3gg	1 x 3gg	1 x 3gg	1 x 3gg	1 x 3gg	1 x 3gg	1 x 3gg								
				Interr. P/D	N	3	3	3	3	3	3	3	3	3									
	Rinnovo/eliminazione deviatori	Villa Literno - Napoli (via Aversa)	Frattamaggiore, Aversa	NAMHLV06	N		3 x 3gg	3 x 3gg	3 x 3gg	3 x 3gg													
				NAMIS05	N		2 x 1gg	2 x 1gg	2 x 1gg	2 x 1gg													
				NAMITE05	N		2 x 2gg	2 x 2gg	2 x 2gg	2 x 2gg													
				Interr. P/D	N		3	3	3	3													

Piano di attività UT Napoli Nodo - II Trimestre 2013

CdL	Impianto	Descrizione	Linea (piano attività)	Tratta	Lavoro (N/D)	Numero Settimana															
						aprile					maggio				giugno						
						14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26			
NAM1IS01	Zona IS Scalo M/M	Attività di ordinaria manutenzione da eseguirsi di notte			N																
		Totale notti previste nella settimana (tenendo conto anche delle attività di manutenzione ordinaria)			N	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
NAM1IS02	Zona IS Cancellò	Attività di ordinaria manutenzione da eseguirsi di notte			N	4 x 2gg	4 x 2gg	4 x 2gg	4 x 2gg	4 x 2gg	4 x 2gg	4 x 2gg	4 x 2gg	4 x 2gg	4 x 2gg	4 x 2gg	4 x 2gg	4 x 2gg			
		Totale notti previste nella settimana (tenendo conto anche delle attività di manutenzione ordinaria)			N	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8		
NAM1IS03	Zona IS Napoli C.le	Varo/rimozione deviatòi	Nodo di Napoli	Napoli C.le	N	2 x 1gg	2 x 1gg	2 x 1gg	2 x 1gg	2 x 1gg	2 x 1gg	2 x 1gg	2 x 1gg	2 x 1gg	2 x 1gg	2 x 1gg	2 x 1gg	2 x 1gg			
		Velocizzazione itin. bin. 17 (arr.) e 18 (part.) a Napoli C.le e banalizzazione bin. staz. elem. AV (16 a 19)			N	2 x 5gg	2 x 5gg	2 x 5gg	2 x 5gg	2 x 5gg	2 x 5gg	2 x 5gg	2 x 5gg	2 x 5gg	2 x 5gg	2 x 5gg	2 x 5gg	2 x 5gg	2 x 5gg	2 x 5gg	
		Attività di ordinaria manutenzione da eseguirsi di notte			N	4 x 5gg	4 x 5gg	4 x 5gg	4 x 5gg	4 x 5gg	4 x 5gg	4 x 5gg	4 x 5gg	4 x 5gg	4 x 5gg	4 x 5gg	4 x 5gg	4 x 5gg	4 x 5gg		
		Totale notti previste nella settimana (tenendo conto anche delle attività di manutenzione ordinaria)			N	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32		
NAM1IS04	Zona IS Campi Flegrei	Attività di ordinaria manutenzione da eseguirsi di notte			N	3 x 3gg	3 x 4gg	3 x 3gg	3 x 4gg	3 x 4gg	3 x 4gg	3 x 4gg	3 x 4gg	3 x 4gg	3 x 4gg	3 x 4gg	3 x 4gg	3 x 4gg			
		Totale notti previste nella settimana (tenendo conto anche delle attività di manutenzione ordinaria)			N	9	12	9	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12		
NAM1IS05	Zona IS Aversa	Rinnovo/eliminazione deviatòi	Villa Literno - Napoli (via Aversa)	Frattamaggiore, Aversa	N		2 x 1gg	2 x 1gg	2 x 1gg	2 x 1gg											
		Attività di ordinaria manutenzione da eseguirsi di notte			N	4 x 4gg	4 x 4gg	4 x 4gg	4 x 4gg	4 x 4gg	4 x 4gg	4 x 4gg	4 x 4gg	4 x 4gg	4 x 4gg	4 x 4gg	4 x 4gg	4 x 4gg	4 x 4gg		
		Totale notti previste nella settimana (tenendo conto anche delle attività di manutenzione ordinaria)			N	16	18	18	18	18	16	16	16	16	16	16	16	16	16		
NAM1IS06	Zona IS Villa Literno	Rinnovo binari e contemporaneo risanamento massiccata	Roma - Napoli (via Formia)	Minturno - Sessa Aurunca	N	2 x 4gg	2 x 4gg	2 x 4gg	2 x 4gg	2 x 4gg	2 x 4gg	2 x 4gg	2 x 4gg	2 x 4gg	2 x 4gg	2 x 4gg	2 x 4gg	2 x 4gg			
		Attività di ordinaria manutenzione da eseguirsi di notte			N	4 x 3gg	4 x 3gg	4 x 3gg	4 x 4gg	4 x 4gg	4 x 4gg	4 x 4gg	4 x 4gg	4 x 4gg	4 x 4gg	4 x 4gg	4 x 4gg	4 x 4gg	4 x 4gg		
		Totale notti previste nella settimana (tenendo conto anche delle attività di manutenzione ordinaria)			N	20	20	20	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24		
NAM1IS24	Zona IS Afragola	Progetto collegamento Nord-Sud - Varo Deviatòi	Roma - Napoli (AV/AC)	Bv. Roma Sud	N	1 x 5gg	1 x 5gg	1 x 5gg	1 x 5gg	1 x 5gg	1 x 5gg	1 x 5gg	1 x 5gg	1 x 5gg	1 x 5gg	1 x 5gg	1 x 5gg	1 x 5gg			
		Rinnovo/posa cavi e cementificazione cavidotti		PJ Gricignano - Bv. Casoria	N	1 x 5gg	1 x 5gg	1 x 5gg	1 x 5gg	1 x 5gg	2 x 5gg	2 x 5gg	2 x 5gg	2 x 5gg	2 x 5gg	2 x 5gg	2 x 5gg	2 x 5gg	2 x 5gg		
		Attività di ordinaria manutenzione da eseguirsi di notte			N	2 x 1gg	2 x 1gg	2 x 1gg	2 x 1gg	2 x 1gg	3 x 1gg	3 x 1gg	3 x 1gg	3 x 1gg	3 x 1gg	3 x 1gg	3 x 1gg	3 x 1gg	3 x 1gg		
		Totale notti previste nella settimana (tenendo conto anche delle attività di manutenzione ordinaria)			N	12	12	12	12	12	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	

Piano di attività UT Napoli Nodo - II Trimestre 2013

CdL	Impianto	Descrizione	Linea (piano attività)	Tratta	Lavoro (N/D)	Numero Settimana													
						aprile					maggio				giugno				
						14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	
NAM1LV02	Tronco LV Cancellò	Attività di ordinaria manutenzione da eseguirsi di notte		N	6 x 3gg	6 x 3gg		6 x 3gg	6 x 3gg		6 x 3gg	6 x 3gg							
		Totale notti previste nella settimana (tenendo conto anche delle attività di manutenzione ordinaria)		N	18	18	0	18	18	0	18	18	0	0	0	0	0		
NAM1LV03	Tronco LV Napoli C.le	Varo/rimozione deviatoi	Nodo di Napoli	Napoli C.le	N	2 x 3gg	2 x 3gg	2 x 3gg	2 x 3gg	2 x 3gg	2 x 3gg	2 x 3gg	2 x 3gg	2 x 3gg	2 x 3gg	2 x 3gg			
		Velocizzazione itin. bin. 17 (arr.) e 18 (part.) a Napoli C.le e banalizzazione bin. staz. elem. AV (16 a 19)			N	3 x 5gg	3 x 5gg	3 x 5gg	3 x 5gg	3 x 5gg	3 x 5gg	3 x 5gg	3 x 5gg	3 x 5gg	3 x 5gg	3 x 5gg			
		Attività di ordinaria manutenzione da eseguirsi di notte		N	2 x 2gg	2 x 2gg	2 x 2gg	2 x 2gg	2 x 2gg	4 x 3gg	4 x 2gg	4 x 3gg	4 x 2gg	4 x 3gg	4 x 2gg	4 x 3gg	4 x 2gg		
		Totale notti previste nella settimana (tenendo conto anche delle attività di manutenzione ordinaria)		N	25	25	25	25	25	33	29	33	29	33	29	33	29		
NAM1LV05	Tronco LV Napoli Campi Flegrei	Attività di ordinaria manutenzione da eseguirsi di notte		N	4 x 1gg	4 x 1gg	4 x 2gg	4 x 1gg	4 x 1gg	4 x 1gg	4 x 1gg	4 x 1gg	4 x 1gg	4 x 1gg	4 x 1gg				
		Totale notti previste nella settimana (tenendo conto anche delle attività di manutenzione ordinaria)		N	4	4	8	4	4	4	4	4	4	4	4	4			
NAM1LV06	Tronco LV Aversa	Rinnovo/eliminazione deviatoi	Villa Literno - Napoli (via Aversa)	Frattamaggiore, Aversa	N		3 x 3gg	3 x 3gg	3 x 3gg	3 x 3gg									
		Attività di ordinaria manutenzione da eseguirsi di notte		N	4 x 3gg	4 x 1gg	4 x 1gg	4 x 1gg	4 x 1gg	4 x 3gg	4 x 3gg	4 x 3gg	4 x 3gg	4 x 3gg	4 x 3gg	4 x 3gg			
		Totale notti previste nella settimana (tenendo conto anche delle attività di manutenzione ordinaria)		N	12	13	13	13	13	12	12	12	12	12	12	12			
NAM1LV07	Tronco LV Villa Literno	Attività di ordinaria manutenzione da eseguirsi di notte		N	4 x 3gg	4 x 3gg	4 x 3gg	4 x 3gg	4 x 3gg	4 x 4gg	4 x 4gg	4 x 4gg	4 x 4gg	4 x 4gg	4 x 4gg				
		Totale notti previste nella settimana (tenendo conto anche delle attività di manutenzione ordinaria)		N	12	12	12	12	12	16	16	16	16	16	16	16			
NAM1LV08	Tronco LV Minturno	Miglioramento della sicurezza della Galleria del Massico dal km 161+235 al km 155+855	Roma - Napoli (via Formia)	Falciano - Sessa Aurunca	N	1 x 3gg	1 x 3gg	1 x 3gg	1 x 3gg	1 x 3gg	1 x 3gg	1 x 3gg	1 x 3gg						
		Rinnovo binari e contemporaneo risanamento massiciata		Minturno - Sessa Aurunca	N	3 x 4gg	3 x 4gg	3 x 4gg	3 x 4gg	3 x 4gg	3 x 4gg	3 x 4gg	3 x 4gg	3 x 4gg	3 x 4gg				
		Attività di ordinaria manutenzione da eseguirsi di notte		N															
		Totale notti previste nella settimana (tenendo conto anche delle attività di manutenzione ordinaria)		N	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	12	12	12		
NAM1LV24	Tronco LV Afragola	Progetto collegamento Nord-Sud - Varo Deviatoi	Roma - Napoli (AV/AC)	Bv. Roma Sud	N	1 x 5gg	1 x 5gg	1 x 5gg	1 x 5gg	1 x 5gg	1 x 5gg	1 x 5gg	1 x 5gg	1 x 5gg	1 x 5gg				
		Attività di ordinaria manutenzione da eseguirsi di notte		N	4 x 2gg	4 x 2gg	4 x 2gg	4 x 2gg	4 x 2gg	4 x 2gg	4 x 2gg	4 x 2gg	4 x 2gg	4 x 2gg	4 x 2gg				
		Totale notti previste nella settimana (tenendo conto anche delle attività di manutenzione ordinaria)		N	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13			

Piano di attività UT Napoli Nodo - II Trimestre 2013

CdL	Impianto	Descrizione	Linea (piano attività)	Tratta	Lavoro (N/D)	Numero Settimana														
						aprile					maggio				giugno					
						14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26		
NAM1TE01	Zona TE Cancellò	Attività di ordinaria manutenzione da eseguirsi di notte		N		3 x 2gg		3 x 2gg		3 x 2gg		3 x 2gg		3 x 2gg		3 x 2gg				
		Totale notti previste nella settimana (tenendo conto anche delle attività di manutenzione ordinaria)		N	0	6	0	6	0	6	0	6	0	6	0	6	0	6	0	
NAM1TE03	Zona TE Napoli C.le	Varo/rimozione deviatoi	Nodo di Napoli	Napoli C.le	N	2 x 2gg		2 x 2gg		2 x 2gg		2 x 2gg		2 x 2gg		2 x 2gg		2 x 2gg		
		Velocizzazione itin. bin. 17 (arr.) e 18 (part.) a Napoli C.le e banalizzazione bin. staz. elem. AV (16 a 19)			N	2 x 5gg	2 x 5gg	2 x 5gg	2 x 5gg	2 x 5gg	2 x 5gg	2 x 5gg	2 x 5gg	2 x 5gg	2 x 5gg	2 x 5gg	2 x 5gg	2 x 5gg	2 x 5gg	2 x 5gg
		Attività di ordinaria manutenzione da eseguirsi di notte			N	2 x 2 gg	2 x 2 gg	2 x 2 gg	2 x 2 gg	2 x 2 gg	2 x 2 gg	2 x 2 gg	2 x 2 gg	2 x 2 gg	2 x 2 gg	2 x 2 gg	2 x 2 gg	2 x 2 gg	2 x 2 gg	2 x 2 gg
		Totale notti previste nella settimana (tenendo conto anche delle attività di manutenzione ordinaria)			N	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18
NAM1TE04	Zona TE Campi Flegrei	Attività di ordinaria manutenzione da eseguirsi di notte		N	4 x 4gg	4 x 4gg	4 x 4gg	4 x 4gg	4 x 4gg	4 x 4gg	4 x 4gg	4 x 4gg	4 x 4gg	4 x 4gg	4 x 4gg	4 x 4gg	4 x 4gg			
		Totale notti previste nella settimana (tenendo conto anche delle attività di manutenzione ordinaria)		N	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16		
NAM1TE05	Zona TE Aversa	Rinnovo/eliminazione deviatoi	Villa Literno - Napoli (via Aversa)	Frattamaggiore, Aversa	N		2 x 2gg	2 x 2gg	2 x 2gg	2 x 2gg										
		Attività di ordinaria manutenzione da eseguirsi di notte		N	4 x 4gg	4 x 3gg	4 x 4gg	4 x 4gg	4 x 3gg	4 x 4gg	4 x 4gg	4 x 4gg	4 x 4gg	4 x 4gg	4 x 4gg	4 x 4gg	4 x 4gg			
		Totale notti previste nella settimana (tenendo conto anche delle attività di manutenzione ordinaria)		N	16	16	20	20	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16		
NAM1TE06	Zona TE Villa Literno	Attività di ordinaria manutenzione da eseguirsi di notte		N	4 x 2gg	4 x 3gg	4 x 4gg	4 x 4gg	4 x 3gg	4 x 4gg	4 x 4gg	4 x 4gg	4 x 4gg	4 x 4gg	4 x 4gg	4 x 4gg	4 x 4gg			
		Totale notti previste nella settimana (tenendo conto anche delle attività di manutenzione ordinaria)		N	8	12	16	16	12	16	16	16	16	16	16	16	16	16		
NAM1TE07	Zona TE Minturno	Miglioramento della sicurezza della Galleria del Massico dal km 161+235 al km 155+855	Roma - Napoli (via Formia)	Falciano - Sessa Aurunca	N	1 x 3gg	1 x 3gg	1 x 3gg	1 x 3gg	1 x 3gg	1 x 3gg	1 x 3gg	1 x 3gg	1 x 3gg						
		Rinnovo binari e contemporaneo risanamento massiciata		Minturno - Sessa Aurunca	N	2 x 4gg	2 x 4gg	2 x 4gg	2 x 4gg	2 x 4gg	2 x 4gg	2 x 4gg	2 x 4gg	2 x 4gg	2 x 4gg	2 x 4gg	2 x 4gg			
		Attività di ordinaria manutenzione da eseguirsi di notte		N	2 x 2gg	2 x 2gg	2 x 2gg	2 x 2gg	2 x 2gg	3 x 2gg	3 x 2gg	3 x 2gg	3 x 2gg	3 x 2gg	3 x 2gg	3 x 2gg	3 x 2gg			
		Totale notti previste nella settimana (tenendo conto anche delle attività di manutenzione ordinaria)		N	15	15	15	15	15	17	17	17	17	14	14	14	14			
NAM1TE24	Zona TE Afragola	Progetto collegamento Nord-Sud - Varo Deviatoi	Roma - Napoli (AV/AC)	Bv. Roma Sud	N	1 x 5gg	1 x 5gg	1 x 5gg	1 x 5gg	1 x 5gg	1 x 5gg	1 x 5gg	1 x 5gg	1 x 5gg	1 x 5gg	1 x 5gg	1 x 5gg			
		Attività di ordinaria manutenzione da eseguirsi di notte		N	2 x 1gg	2 x 1gg	2 x 1gg	2 x 1gg	2 x 1gg	2 x 1gg	2 x 1gg	2 x 1gg	2 x 1gg	2 x 1gg	2 x 1gg	2 x 1gg				
		Rinnovo/posa cavi e cementificazione cavidotti		N	1 x 5gg	1 x 5gg	1 x 5gg	1 x 5gg	1 x 5gg	1 x 5gg	1 x 5gg	1 x 5gg	1 x 5gg	1 x 5gg	1 x 5gg	1 x 5gg				
		Totale notti previste nella settimana (tenendo conto anche delle attività di manutenzione ordinaria)		N	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12			

Piano di attività UT Napoli Nodo - II Trimestre 2013

Previsione di massima delle attività eseguite di notte

	CdL	aprile				maggio				giugno				apr.	magg.	giugn			
		14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	Tot.	Tot.	Tot.		
		Progetto collegamento Nord-Sud - Varo Deviatoi Bv. Roma Sud																75	60
Impegno personale n° totale agenti per notti per settimana e per mese	NAM1LV24	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	25	20	20		
	NAM1IS24	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	25	20	20		
	NAM1TE24	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	25	20	20		
	Varo/rimozione deviatoi Napoli C.le																60	48	48
	NAM1LV03	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	30	24	24		
	NAM1IS03	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	10	8	8		
	NAM1TE03	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	20	16	16		
	Velocizzazione itinerari binari 17 (arrivi) e 18 (partenze) a Napoli C.le e banalizzazione binari stazione elementare AV di Napoli C.le (16 a 19)																175	140	140
	NAM1LV03	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	75	60	60		
	NAM1IS03	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	50	40	40		
	NAM1TE03	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	50	40	40		
	0512A2013-1001 - Rinnovo binari e contemporaneo risanamento massicciata tratta Minturno - Sessa Aurunca																140	112	112
	NAM1LV08	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	60	48	48		
	NAM1IS06	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	40	32	32		
	NAM1TE07	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	40	32	32		
	0512A2013-1008 - Rinnovo/posa cavi e cementificazione cavidotti tratta PJ Gricignano - Bv. Casoria																50	60	60
	NAM1IS24	5	5	5	5	5	10	10	10	10	10	10	10	10	25	40	40		
	NAM1TE24	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	25	20	20		
	(58) - 1275A2005-1001 - Miglioramento della sicurezza della Galleria del Massico dal km 161+235 al km 155+855																30	24	
	NAM1LV08	3	3	3	3	3	3	3	3	3					15	12			
	NAM1TE07	3	3	3	3	3	3	3	3	3					15	12			
	Rinnovo/eliminazione deviatoi a mezzo ditta deviatoi stazioni di Frattamaggiore ed Aversa																60		
	NAM1LV06		9	9	9	9									36				
	NAM1IS05		2	2	2	2									8				
NAM1TE05		4	4	4	4									16					

Piano di attività UT Napoli Nodo - II Trimestre 2013

Previsione di massima delle attività eseguite di notte

	CdL	aprile					maggio					giugno				apr.	magg.	giugn
		14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	Tot.	Tot.	Tot.	
Impegno personale n° totale agenti per settimana e per mese	Attività di ordinaria manutenzione da eseguirsi di notte														874	788	752	
	NAM1IS01																	
	NAM1IS02	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	40	32	32	
	NAM1IS03	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	100	80	80	
	NAM1IS04	9	12	9	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	54	48	48	
	NAM1IS05	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	80	64	64	
	NAM1IS06	12	12	12	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	68	64	64	
	NAM1IS24	2	2	2	2	2	3	3	3	3	3	3	3	3	10	12	12	
	NAM1LV02	18	18		18	18		18	18						72	36		
	NAM1LV03	4	4	4	4	4	12	8	12	8	12	8	12	8	20	40	40	
	NAM1LV05	4	4	8	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	24	16	16	
	NAM1LV06	12	4	4	4	4	12	12	12	12	12	12	12	12	28	48	48	
	NAM1LV07	12	12	12	12	12	16	16	16	16	16	16	16	16	60	64	64	
	NAM1LV08																	
	NAM1LV24	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	40	32	32	
	NAM1TE01		6		6		6		6		6		6		12	12	12	
	NAM1TE03	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	20	16	16	
	NAM1TE04	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	80	64	64	
	NAM1TE05	16	12	16	16	12	16	16	16	16	16	16	16	16	72	64	64	
	NAM1TE06	8	12	16	16	12	16	16	16	16	16	16	16	16	64	64	64	
NAM1TE07	4	4	4	4	4	6	6	6	6	6	6	6	6	20	24	24		
NAM1TE24	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	10	8	8		

Piano di attività UT Napoli Nodo - II Trimestre 2013

Previsione di massima delle attività eseguite di notte

		CdL	aprile					maggio					giugno				apr.	magg.	giugn
			14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	Tot.	Tot.	Tot.	
Impegno medio notti per agente	NAM1IS01	Zona IS Scalo M/M	Tot. notti																
		Agenti utilizzabili in lavori notturni n°	Media agente	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
	NAM1IS02	Zona IS Cancellò	Tot. notti	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	40	32	32	
		Agenti utilizzabili in lavori notturni n°	Media agente	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	2,9	2,3	2,3	
	NAM1IS03	Zona IS Napoli C.le	Tot. notti	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	160	128	128	
		Agenti utilizzabili in lavori notturni n°	Media agente	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	7,3	5,8	5,8	
	NAM1IS04	Zona IS Campi Flegrei	Tot. notti	9	12	9	12	12	12	12	12	12	12	12	12	54	48	48	
		Agenti utilizzabili in lavori notturni n°	Media agente	1,3	1,7	1,3	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	7,7	6,9	6,9	
	NAM1IS05	Zona IS Aversa	Tot. notti	16	18	18	18	18	16	16	16	16	16	16	16	88	64	64	
		Agenti utilizzabili in lavori notturni n°	Media agente	1,1	1,3	1,3	1,3	1,3	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	6,3	4,6	4,6	
	NAM1IS06	Zona IS Villa Literno	Tot. notti	20	20	20	24	24	24	24	24	24	24	24	24	108	96	96	
		Agenti utilizzabili in lavori notturni n°	Media agente	1,4	1,4	1,4	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	7,7	6,9	6,9	
	NAM1IS24	Zona IS Afragola	Tot. notti	12	12	12	12	12	18	18	18	18	18	18	18	60	72	72	
		Agenti utilizzabili in lavori notturni n°	Media agente	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	6,7	8,0	8,0	
	NAM1LV02	Tronco LV Cancellò	Tot. notti	18	18		18	18		18	18					72	36		
		Agenti utilizzabili in lavori notturni n°	Media agente	1,1	1,1	0,0	1,1	1,1	0,0	1,1	1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	4,5	2,3	0,0	
	NAM1LV03	Tronco LV Napoli C.le	Tot. notti	25	25	25	25	25	33	29	33	29	33	29	33	125	124	124	
		Agenti utilizzabili in lavori notturni n°	Media agente	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	2,1	1,8	2,1	1,8	2,1	1,8	2,1	7,8	7,8	7,8	
	NAM1LV05	Tronco LV Campi Flegrei	Tot. Notti	4	4	8	4	4	4	4	4	4	4	4	4	24	16	16	
		Agenti utilizzabili in lavori notturni n°	Media agente	0,3	0,3	0,7	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	2,0	1,3	1,3	
	NAM1LV06	Tronco LV Aversa	Tot. notti	12	13	13	13	13	12	12	12	12	12	12	12	64	48	48	
		Agenti utilizzabili in lavori notturni n°	Media agente	1,1	1,2	1,2	1,2	1,2	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	5,8	4,4	4,4	
	NAM1LV07	Tronco LV Villa Literno	Tot. notti	12	12	12	12	12	16	16	16	16	16	16	16	60	64	64	
		Agenti utilizzabili in lavori notturni n°	Media agente	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	5,5	5,8	5,8	
	NAM1LV08	Tronco LV Minturno	Tot. notti	15	15	15	15	15	15	15	15	15	12	12	12	75	60	48	
		Agenti utilizzabili in lavori notturni n°	Media agente	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9	1,5	1,5	1,5	9,4	7,5	6,0	
	NAM1LV24	Tronco LV Afragola	Tot. notti	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	65	52	52	
		Agenti utilizzabili in lavori notturni n°	Media agente	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	7,2	5,8	5,8	
	NAM1TE01	Zona TE Cancellò	Tot. notti		6		6		6		6		6		6	12	12	12	
		Agenti utilizzabili in lavori notturni n°	Media agente	0,0	0,7	0,0	0,7	0,0	0,7	0,0	0,7	0,0	0,7	0,0	0,7	1,3	1,3	1,3	
	NAM1TE03	Zona TE Napoli C.le	Tot. notti	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	90	72	72	
		Agenti utilizzabili in lavori notturni n°	Media agente	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	6,4	5,1	5,1	
	NAM1TE04	Zona TE Campi Flegrei	Tot. notti	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	80	64	64	
	Agenti utilizzabili in lavori notturni n°	Media agente	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	7,3	5,8	5,8		
NAM1TE05	Zona TE Aversa	Tot. notti	16	16	20	20	16	16	16	16	16	16	16	16	88	64	64		
	Agenti utilizzabili in lavori notturni n°	Media agente	1,3	1,3	1,7	1,7	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	7,3	5,3	5,3		
NAM1TE06	Zona TE Villa Literno	Tot. notti	8	12	16	16	12	16	16	16	16	16	16	16	64	64	64		
	Agenti utilizzabili in lavori notturni n°	Media agente	1,0	1,5	2,0	2,0	1,5	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	8,0	8,0	8,0		
NAM1TE07	Zona TE Minturno	Tot. notti	15	15	15	15	15	17	17	17	17	14	14	14	75	68	56		
	Agenti utilizzabili in lavori notturni n°	Media agente	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,7	1,7	1,7	1,7	1,4	1,4	1,4	7,5	6,8	5,6		
NAM1TE24	Zona TE Afragola	Tot. notti	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	60	48	48		
	Agenti utilizzabili in lavori notturni n°	Media agente	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	7,5	6,0	6,0		

Piano di attività UT Napoli Nodo - II Trimestre 2013

Previsione di massima delle attività eseguite di notte

	CdL	aprile					maggio				giugno				apr.	magg.	giugn
		14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	Tot.	Tot.	Tot.

Attività UT Nord Est Caserta - II Trimestre 2013

WBS	Descrizione	Linea (piano attività)	Tratta	Risorse	Lavoro (N/D)	Numero Settimana												Note				
						Aprile					Maggio				Giugno							
						14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25		26			
512	RINNOVO TE VAIRANO-CAPUA	Roma Napoli (via Cassino)	VAIRANO	NAM3TE08	D	2 x 4gg	2 x 5gg	2 x 5gg	2 x 4gg	2 x 4gg	2 x 5gg	2 x 5gg	2 x 5gg	2 x 5gg	2 x 5gg	2 x 5gg	2 x 5gg					
				Interr. P/D	D	4	5	5	4	4	5	5	5	5	5	5	5	5				
512	RINNOVO TE VAIRANO-CAPUA	Roma Napoli (via Cassino)	CAPUA-SPARANISE	NAM3TE16	D	2 x 4gg	2 x 5gg	2 x 5gg	2 x 4gg	2 x 4gg	2 x 5gg	2 x 5gg	2 x 5gg	2 x 5gg	2 x 5gg	2 x 5gg	2 x 5gg	2 x 5gg				
				Interr. P/D	D	4	5	5	4	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5			
512	Risanamento tratti saltuari 1° e 2° binario in stazione di CASERTA (MSA)	Roma Napoli (via Cassino)	CASERTA	NAM3LV22	D	4 x 4gg	4 x 5gg															
				NAM3IS23	D	2 x 1gg	2 x 1gg															
				NAM3TE02	D	1 x 4gg	1 x 5gg															
				Interr. P/D	D	4	5															
	Sostituzione tratti di cavi in basso isolamento e blindatura tra Caserta e Cassino, C.A.n.31 del 23/7/2012 AQ 36/2009	Roma Napoli (via Cassino)	CASSINO-ROCCA	NAM3TE08	D	2 x 4gg	2 x 5gg	2 x 5gg	2 x 4gg	2 x 4gg	2 x 5gg	2 x 5gg	2 x 5gg	2 x 5gg	2 x 5gg							
				NAM3IS22	D	1 x 4gg	1 x 5gg	1 x 5gg	1 x 4gg	1 x 4gg	1 x 5gg	1 x 5gg	1 x 5gg	1 x 5gg	1 x 5gg							
				Interr. P/D	D	4	5	5	4	4	5	5	5	5	5							
512	RINNOVO ARMAMENTO VAIRANO-MIGNANO	Roma Napoli (via Cassino)	VAIRANO-MIGNANO	NAM3LV04	D	4 x 4gg	4 x 5gg	4 x 5gg	4 x 4gg	4 x 4gg	4 x 5gg	4 x 5gg	4 x 5gg	4 x 5gg								
				NAM3IS22	D	2 x 4gg	2 x 5gg	2 x 5gg	2 x 4gg	2 x 4gg	2 x 5gg	2 x 5gg	2 x 5gg	2 x 5gg	2 x 5gg							
				NAM3TE08	D	2 x 4gg	2 x 5gg	2 x 5gg	2 x 4gg	2 x 4gg	2 x 5gg	2 x 5gg	2 x 5gg	2 x 5gg	2 x 5gg							
				Interr. P/D	D	4	5	5	4	4	5	5	5	5								
512	Sostituzione traverse (n.5000) con risanamento: SPARANISE-2°B°CE N. (MSA)	Roma Napoli (via Cassino)	SPARANISE-2°B°CE N.	NAM3LV23	N										2 x 5gg	2 x 5gg	2 x 5gg	2 x 5gg				
				NAM3IS20	N											2 x 5gg	2 x 5gg	2 x 5gg	2 x 5gg			
				NAM3TE16	N												2 x 5gg	2 x 5gg	2 x 5gg	2 x 5gg		
				NAM3LV22	N												2 x 5gg	2 x 5gg	2 x 5gg	2 x 5gg		
				NAM3IS23	N												2 x 5gg	2 x 5gg	2 x 5gg	2 x 5gg		
				NAM3TE02	N												2 x 5gg	2 x 5gg	2 x 5gg	2 x 5gg		
				Interr. P/D	N												5	5	5	5		
	LAVORI AL P.S.A. DI VENAFRO	Roma Napoli (via Cassino)	VENAFRO	NAM3TE16	D	2 x 4gg	2 x 5gg															
				Interr. P/D	D	4	5															
512	Rinnovo due deviatori 1a e 2a in stazione di SPARANISE (MSA)	Roma Napoli (via Cassino)	SPARANISE	NAM3LV23	N						2 x 5gg	2 x 5gg										
				NAM3IS20	N							1 x 5gg	1 x 5gg									
				NAM3TE16	N							1 x 5gg	1 x 5gg									
				Interr. P/D	N							5	5									
	Rinnovo 4+2 deviatori in			NAM3LV22	N								2 x 5gg	2 x 5gg	2 x 5gg	2 x 5gg	2 x 5gg	2 x 5gg				

Attività UT Nord Est Caserta - II Trimestre 2013

WBS	Descrizione	Linea (piano attività)	Tratta	Risorse	Lavoro (N/D)	Numero Settimana												Note			
						Aprile					Maggio				Giugno						
						14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25		26		
610	stazione di CASERTA(CM):18a, 106a, 6b/5, 4b/3;12A/13B-29B/30A	Roma Napoli (via Cassino)	CASERTA	NAM3IS23	N								1 x 5gg	1 x 5gg	1 x 5gg	1 x 5gg	1 x 5gg	1 x 5gg			
				NAM3TE02	N										1 x 5gg	1 x 5gg	1 x 5gg	1 x 5gg		1 x 5gg	1 x 5gg
				Interr. P/D	N											5	5	5		5	5
	STAZIONE DI PIGNATARO - REALIZZAZIONE DI UN NUOVO SOTTOPASSO PEDONALE	Roma Napoli (via Cassino)	PIGNATARO	NAM3LV23	N											1 x 5gg	1 x 5gg	1 x 5gg	1 x 5gg	Attività mai iniziata da parte dell'I.A., Si attendono notizie da parte di S.O.ING&TEC.	
				NAM3IS20	N													1 x 2gg			1 x 2gg
				NAM3TE16	N													2 x 2gg			2 x 2gg
				Interr. P/D	N												5	5	5		5
	STAZIONE DI CAPUA: REALIZZAZIONE DI UN NUOVO SOTTOPASSO PEDONALE	Roma Napoli (via Cassino)	CAPUA	NAM3LV22	D	1 x 4gg	1 x 5gg	1 x 5gg	1 x 4gg	1 x 4gg											
				NAM3TE16	D	1 x 1gg	1 x 1gg	1 x 1gg	1 x 1gg	1 x 1gg											
				Interr. P/D	D	4	5	5	4	4											
	RILEVATI CEDEVOLI Bin/PARI E ALCUNI TRATTI Bin/DISPARI	Roma Napoli AV/AC	PM TORA-PJ GRICIGNANO	NAM3LV22	N	5 x 4gg	5 x 5gg	5 x 5gg	5 x 4gg	5 x 4gg	5 x 4gg	5 x 4gg	5 x 4gg	5 x 4gg							
				NAM3IS23	N	2 x 4gg	2 x 5gg	2 x 5gg	2 x 4gg	2 x 4gg	2 x 4gg	2 x 4gg	2 x 4gg	2 x 4gg	2 x 4gg						
				NAM3TE02	N	2 x 4gg	2 x 5gg	2 x 5gg	2 x 4gg	2 x 4gg	2 x 4gg	2 x 4gg	2 x 4gg	2 x 4gg	2 x 4gg						
				Interr. P/D	N	4	5	5	4	4	4	4	4	4	4						
O.M.	MOLATURA ROTAIE	Roma Napoli AV/AC	PM S.GIOVANNI-PJ GRICIGNANO	NAM3LV22	N					5 x 4gg	2 x 5gg										
				NAM3LV23	N			2 x 5gg	2 x 4gg												
				NAM3LV04	N	2 x 4gg	2 x 5gg														
				NAM3IS23	N								3 x 1gg								
				NAM3IS20	N			3 x 1gg													
				NAM3IS22	N		3 x 1gg														
				Interr. P/D	N	4	5	5	4	4	5										
	Sistema rilevamento caduta veicoli "SIRIO"	Roma Napoli AV/AC	PM TORA-PJ GRICIGNANO	NAM3LV23	N											2 x 5gg	2 x 5gg	2 x 5gg	IN ATTESA DI DEFINIZIONE DEL PERIODO DA PARTE DI DPR ROMA		
				NAM3TE16	N													2 x 5gg		2 x 5gg	
				Interr. P/D	N												5	5		5	
	Raddoppio Cervaro-Bovino	Aversa-Foggia	CERVARO-BOVINO	NAM3LV21	D	1 x 3gg	1 x 4gg	1 x 4gg	1 x 3gg	1 x 3gg	1 x 4gg	1 x 4gg	1 x 4gg	1 x 4gg	1 x 4gg	1 x 4gg	1 x 4gg				
				Interr. P/D	D	3	4	4	3	3	4	4	4	4	4	4	4		4	4	
	Raddoppio Cervaro-Bovino	Aversa-Foggia	CERVARO-BOVINO	NAM3LV21	N	1 x 3gg	1 x 4gg	1 x 4gg	1 x 3gg	1 x 3gg	1 x 4gg	1 x 4gg	1 x 4gg	1 x 4gg	1 x 4gg	1 x 4gg	1 x 4gg	1 x 4gg			
				NAM3TE18	N	2 x 3gg	2 x 4gg	2 x 4gg	2 x 3gg	2 x 3gg	2 x 4gg	2 x 4gg	2 x 4gg	2 x 4gg	2 x 4gg	2 x 4gg	2 x 4gg	2 x 4gg		2 x 4gg	
				Interr. P/D	N	3	4	4	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4		4	4
				NAM3LV18	N							3 x 4gg	3 x 4gg	3 x 4gg							

Attività UT Nord Est Caserta - II Trimestre 2013

WBS	Descrizione	Linea (piano attività)	Tratta	Risorse	Lavoro (N/D)	Numero Settimana												Note		
						Aprile					Maggio				Giugno					
						14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25		26	
O.M.	DOWN SIZING: VARIE STAZIONI	Aversa-Foggia	STAZIONI VARIE (Pianerottolo; Paduli; Benevento; Savignano)	NAM3LV21	N	3 x 3gg	3 x 3gg	3 x 3gg	3 x 3gg	3 x 2gg	3 x 3gg					3 x 3gg	3 x 3gg	3 x 3gg		
				NAM3IS15	N	2 x 3gg	2 x 3gg	2 x 3gg	2 x 3gg	2 x 2gg	2 x 3gg	2 x 4gg	2 x 4gg	2 x 4gg						
				NAM3IS17	N							2 x 4gg	2 x 4gg	2 x 4gg						
				NAM3IS19	N	2 x 3gg	2 x 3gg	2 x 3gg	2 x 3gg	2 x 2gg	2 x 3gg									
				NAM3TE15	N							2 x 4gg	2 x 4gg	2 x 4gg						
				NAM3TE18	N	2 x 3gg	2 x 3gg	2 x 3gg	2 x 3gg	2 x 2gg	2 x 3gg	2 x 4gg	2 x 4gg	2 x 4gg			2 x 3gg	2 x 3gg	2 x 3gg	
				Interr. P/D	N	3	3	3	3	2	3	4	4	4			3	3	3	
O.M.	Livellamento tratti saltuari di binario a mezzo CM	Aversa-Foggia	TRATTE Varie	NAM3LV16	N	3 x 3gg	3 x 4gg	3 x 4gg												
				NAM3LV18	N				3 x 3gg	3 x 3gg	3 x 4gg									
				NAM3LV21	N								3 x 3gg	3 x 3gg						
				NAM3TE15	N	2 x 3gg	2 x 4gg	2 x 4gg												
				NAM3TE18	N				2 x 3gg	2 x 3gg	2 x 4gg		2 x 3gg	2 x 3gg						
				Interr. P/D	N	3	4	4	3	3	4		3	3						
O.M.	Risanamenro massicciata galleria Colle Limata	Aversa-Foggia	TELESE	NAM3LV16	N									3 x 4gg	3 x 4gg	3 x 4gg	3 x 4gg			
				NAM3TE15	N										2 x 4gg	2 x 4gg	2 x 4gg	2 x 4gg		
				Interr. P/D	N										4	4	4	4		

Piano di attività UT Nord Est Caserta - II Trimestre 2013

CdL	Impianto	Descrizione	Linea (piano attività)	Tratta	Lavoro (N/D)	Numero Settimana															
						Aprile					Maggio				Giugno						
						14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26			
NAM3IS20	Zona IS Vairano	Sostituzione traverse (n.5000) con risanamento: SPARANISE-2°B°CE N. (MSA)	Roma Napoli (via Cassino)	SPARANISE-2°B° CE N.	N											2 x 5gg	2 x 5gg	2 x 5gg	2 x 5gg		
		Rinnovo due deviatoi 1a e 2a in stazione di SPARANISE (MSA)	Roma Napoli (via Cassino)	SPARANISE	N						1 x 5gg	1 x 5gg									
		STAZIONE DI PIGNATARO - REALIZZAZIONE DI UN NUOVO SOTTOPASSO PEDONALE	Roma Napoli (via Cassino)	PIGNATARO	N											1 x 2gg		1 x 2gg			
		MOLATURA ROTAIE	Roma Napoli AV/AC	PM S.GIOVANNI-PJ GRICIGNANO	N			3 x 1gg													
		Attività di ordinaria manutenzione da eseguirsi di notte					N	3 x 2gg	3 x 2gg	3 x 2gg	3 x 2gg	3 x 2gg	3 x 2gg	3 x 2gg	3 x 2gg	3 x 2gg	3 x 2gg	3 x 2gg	3 x 2gg	3 x 2gg	3 x 2gg
		Totale notti previste nella settimana (tenendo conto anche delle attività di manutenzione ordinaria)					N	6	6	9	6	6	11	11	6	6	18	16	18	16	
NAM3IS22	Zona IS Rocca D'Ev.	Sostituzione tratti di cavI in basso isolamento e blindatura tra Caserta e Cassino, C.A.n.31 del 23/7/2012	Roma Napoli (via Cassino)	CASSINO-ROCCA	D	1 x 4gg	1 x 5gg	1 x 5gg	1 x 4gg	1 x 4gg	1 x 5gg	1 x 5gg	1 x 5gg	1 x 5gg	1 x 5gg						
		RINNOVO ARMAMENTO VAIRANO-MIGNANO	Roma Napoli (via Cassino)	VAIRANO-MIGNANO	D	2 x 4gg	2 x 5gg	2 x 5gg	2 x 4gg	2 x 4gg	2 x 5gg	2 x 5gg	2 x 5gg	2 x 5gg							
		MOLATURA ROTAIE	Roma Napoli AV/AC	PM S.GIOVANNI-PJ GRICIGNANO	N		3 x 1gg														
		Attività di ordinaria manutenzione da eseguirsi di notte					N	3 x 1gg	3 x 1gg	3 x 1gg	3 x 1gg	3 x 1gg	3 x 1gg	3 x 1gg	3 x 1gg	3 x 1gg	3 x 1gg	3 x 1gg	3 x 1gg	3 x 1gg	3 x 1gg
		Totale notti previste nella settimana (tenendo conto anche delle attività di manutenzione ordinaria)					N	3	6	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
NAM3IS23	Zona IS S. Maria C.V.	Risanamento tratti saltuari 1° e 2° binario in stazione di CASERTA (MSA)	Roma Napoli (via Cassino)	CASERTA	D	2 x 1gg	2 x 1gg														
		Sostituzione traverse (n.5000) con risanamento: SPARANISE-2°B°CE N. (MSA)	Roma Napoli (via Cassino)	SPARANISE-2°B° CE N.	N											2 x 5gg	2 x 5gg	2 x 5gg	2 x 5gg		
		Rinnovo 4+2 deviatoi in stazione di CASERTA(CM):18a, 106a, 6b/5, 4b/3;12A/13B-29B/30A	Roma Napoli (via Cassino)	CASERTA	N									1 x 5gg	1 x 5gg	1 x 5gg	1 x 5gg	1 x 5gg	1 x 5gg	1 x 5gg	
		RILEVATI CEDEVOLI Bin/PARI E ALCUNI TRATTI Bin/DISPARI	Roma Napoli AV/AC	PM TORA-PJ GRICIGNANO	N	2 x 4gg	2 x 5gg	2 x 5gg	2 x 4gg	2 x 4gg	2 x 4gg	2 x 4gg	2 x 4gg	2 x 4gg	2 x 4gg						
		MOLATURA ROTAIE	Roma Napoli AV/AC	PM S.GIOVANNI-PJ GRICIGNANO	N							3 x 1gg									
		Attività di ordinaria manutenzione da eseguirsi di notte					N	3 x 2gg	3 x 2gg	3 x 2gg	3 x 2gg	3 x 2gg	3 x 2gg	3 x 2gg	3 x 2gg	3 x 2gg	3 x 2gg	3 x 2gg	3 x 2gg	3 x 2gg	3 x 2gg
		Totale notti previste nella settimana (tenendo conto anche delle attività di manutenzione ordinaria)					N	14	16	16	14	14	17	14	19	19	21	21	21	21	21
NAM3IS15	Zona IS Telese	DOWN SIZING: VARIE STAZIONI	Aversa-Foggia	STAZIONI VARIE (Pianerottolo; Paduli; Benevento; Frosinone)	N	2 x 3gg	2 x 3gg	2 x 3gg	2 x 3gg	2 x 2gg	2 x 3gg	2 x 4gg	2 x 4gg	2 x 4gg							
		Attività di ordinaria manutenzione da eseguirsi di notte					N	4 x 1gg	4 x 1gg	4 x 1gg	4 x 1gg	4 x 1gg	4 x 1gg	4 x 1gg	4 x 1gg	4 x 1gg	4 x 1gg	4 x 1gg	4 x 1gg	4 x 1gg	
		Totale notti previste nella settimana (tenendo conto anche delle attività di manutenzione ordinaria)					N	10	10	10	10	8	10	12	12	12	4	4	4	4	
NAM3IS17	Zona IS Benevento	DOWN SIZING: VARIE STAZIONI	Aversa-Foggia	STAZIONI VARIE (Pianerottolo; Paduli; Benevento; Frosinone)	N							2 x 4gg	2 x 4gg	2 x 4gg							
		Attività di ordinaria manutenzione da eseguirsi di notte					N														

Piano di attività UT Nord Est Caserta - II Trimestre 2013

CdL	Impianto	Descrizione	Linea (piano attività)	Tratta	Lavoro (N/D)	Numero Settimana													
						Aprile					Maggio				Giugno				
						14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	
		Totale notti previste nella settimana (tenendo conto anche delle attività di manutenzione ordinaria)			N	0	0	0	0	0	0	8	8	8	0	0	0	0	
NAM3IS19	Zona IS Savignano	DOWN SIZING: VARIE STAZIONI	Aversa-Foggia	STAZIONI VARIE (Pianerottolo; Paduli; B.)	N	2 x 3gg	2 x 3gg	2 x 3gg	2 x 3gg	2 x 2gg	2 x 3gg								
		Attività di ordinaria manutenzione da eseguirsi di notte			N														
		Totale notti previste nella settimana (tenendo conto anche delle attività di manutenzione ordinaria)			N	6	6	6	6	4	6	0	0	0	0	0	0	0	0
NAM3LV04	Tronco LV Rocca D'Ev.	RINNOVO ARMAMENTO VAIRANO-MIGNANO	Roma Napoli (via Cassino)	VAIRANO-MIGNANO	D	4 x 4gg	4 x 5gg	4 x 5gg	4 x 4gg	4 x 4gg	4 x 5gg	4 x 5gg	4 x 5gg	4 x 5gg					
		MOLATURA ROTAIE	Roma Napoli AV/AC	PM S.GIOVANNI-PJ GRICIGNANO	N	2 x 4gg	2 x 5gg												
		Attività di ordinaria manutenzione da eseguirsi di notte			N	2 x 1gg	2 x 1gg		2 x 1gg	4 x 1gg	2 x 1gg			2 x 1gg	2 x 1gg	4 x 1gg		2 x 1gg	
		Totale notti previste nella settimana (tenendo conto anche delle attività di manutenzione ordinaria)			N	10	12	0	2	4	2	0	0	2	2	4	0	2	
NAM3LV22	Tronco LV Capua	Risanamento tratti saltuari 1° e 2° binario in stazione di CASERTA (MSA)	Roma Napoli (via Cassino)	CASERTA	D	4 x 4gg	4 x 5gg												
		Sostituzione traverse (n.5000) con risanamento: SPARANISE-2°B°CE N. (MSA)	Roma Napoli (via Cassino)	SPARANISE-2°B°CE N.	N											2 x 5gg	2 x 5gg	2 x 5gg	2 x 5gg
		Rinnovo 4+2 deviatori in stazione di CASERTA(CM):18a, 106a, 6b/5, 4b/3;12A/13B-29B/30A	Roma Napoli (via Cassino)	CASERTA	N									2 x 5gg	2 x 5gg	2 x 5gg	2 x 5gg	2 x 5gg	2 x 5gg
		STAZIONE DI CAPUA: REALIZZAZIONE DI UN NUOVO SOTTOPASSO PEDONALE	Roma Napoli (via Cassino)	CAPUA	D	1 x 4gg	1 x 5gg	1 x 5gg	1 x 4gg	1 x 4gg									
		RILEVATI CEDEVOLI Bin/PARI E ALCUNI TRATTI Bin/DISPARI	Roma Napoli AV/AC	PM TORA-PJ GRICIGNANO	N	5 x 4gg	5 x 5gg	5 x 5gg	5 x 4gg	5 x 4gg	5 x 4gg	5 x 4gg	5 x 4gg	5 x 4gg	5 x 4gg				
		MOLATURA ROTAIE	Roma Napoli AV/AC	PM S.GIOVANNI-PJ GRICIGNANO	N					5 x 4gg	2 x 5gg								
		Attività di ordinaria manutenzione da eseguirsi di notte			N	2 x 1gg	2 x 1gg		2 x 1gg	4 x 1gg	2 x 1gg			2 x 1gg	2 x 1gg	4 x 1gg		2 x 1gg	
		Totale notti previste nella settimana (tenendo conto anche delle attività di manutenzione ordinaria)			N	22	27	25	22	44	32	20	30	32	22	24	20	22	
NAM3LV23	Tronco LV Vairano	Sostituzione traverse (n.5000) con risanamento: SPARANISE-2°B°CE N. (MSA)	Roma Napoli (via Cassino)	SPARANISE-2°B°CE N.	N										2 x 5gg	2 x 5gg	2 x 5gg	2 x 5gg	
		Rinnovo due deviatori 1a e 2a in stazione di SPARANISE (MSA)	Roma Napoli (via Cassino)	SPARANISE	N						2 x 5gg	2 x 5gg							
		STAZIONE DI PIGNATARO - REALIZZAZIONE DI UN NUOVO SOTTOPASSO PEDONALE	Roma Napoli (via Cassino)	PIGNATARO	N										1 x 5gg	1 x 5gg	1 x 5gg	1 x 5gg	
		MOLATURA ROTAIE	Roma Napoli AV/AC	PM S.GIOVANNI-PJ GRICIGNANO	N			2 x 5gg	2 x 4gg										
		Sistema rilevamento caduta veicoli "SIRIO"	Roma Napoli AV/AC	PM TORA-PJ GRICIGNANO	N											2 x 5gg	2 x 5gg	2 x 5gg	
		Attività di ordinaria manutenzione da eseguirsi di notte			N	2 x 1gg	2 x 1gg		2 x 1gg	2 x 1gg	2 x 1gg			2 x 1gg	2 x 1gg	2 x 1gg		2 x 1gg	
		Totale notti previste nella settimana (tenendo conto anche delle attività di manutenzione ordinaria)			N	2	2	10	10	2	12	10	0	2	17	27	25	27	

Piano di attività UT Nord Est Caserta - II Trimestre 2013

CdL	Impianto	Descrizione	Linea (piano attività)	Tratta	Lavoro (N/D)	Numero Settimana													
						Aprile					Maggio				Giugno				
						14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	
NAM3LV16	Tronco LV Telese	Livellamento tratti saltuari di binario a mezzo CM	Aversa-Foggia	TRATTE Varie	N	3 x 3gg	3 x 4gg	3 x 4gg											
		Risanamenro massicciata galleria Colle Limata	Aversa-Foggia	TELESE	N										3 x 4gg	3 x 4gg	3 x 4gg	3 x 4gg	
		Attività di ordinaria manutenzione da eseguirsi di notte				N	4 x 3gg		4 x 4gg		3 x 3gg	3 x 4gg		3 x 4gg	3 x 4gg		3 x 4gg	3 x 4gg	3 x 4gg
		Totale notti previste nella settimana (tenendo conto anche delle attività di manutenzione ordinaria)				N	21	12	28	0	9	12	0	12	12	12	24	24	24
NAM3LV18	Tronco LV Benevento	DOWN SIZING: VARIE STAZIONI	Aversa-Foggia	STAZIONI VARIE (Pianerottolo; Paduli; ...)	N							3 x 4gg	3 x 4gg	3 x 4gg					
		Livellamento tratti saltuari di binario a mezzo CM	Aversa-Foggia	TRATTE Varie	N				3 x 3gg	3 x 3gg	3 x 4gg								
		Attività di ordinaria manutenzione da eseguirsi di notte				N	3 x 4gg		3 x 4gg			3 x 4gg			3 x 4gg			3 x 4gg	
		Totale notti previste nella settimana (tenendo conto anche delle attività di manutenzione ordinaria)				N	12	0	12	9	9	24	12	12	24	0	0	0	12
NAM3LV21	Tronco LV Savignano	Raddoppio Cervaro-Bovino	Aversa-Foggia	CERVARO-BOVINO	D	1 x 3gg	1 x 4gg	1 x 4gg	1 x 3gg	1 x 3gg	1 x 4gg	1 x 4gg	1 x 4gg	1 x 4gg	1 x 4gg	1 x 4gg	1 x 4gg	1 x 4gg	
		Raddoppio Cervaro-Bovino	Aversa-Foggia	CERVARO-BOVINO	N	1 x 3gg	1 x 4gg	1 x 4gg	1 x 3gg	1 x 3gg	1 x 4gg	1 x 4gg	1 x 4gg	1 x 4gg	1 x 4gg	1 x 4gg	1 x 4gg	1 x 4gg	1 x 4gg
		DOWN SIZING: VARIE STAZIONI	Aversa-Foggia	STAZIONI VARIE (Pianerottolo; Paduli; ...)	N	3 x 3gg	3 x 3gg	3 x 3gg	3 x 3gg	3 x 2gg	3 x 3gg					3 x 3gg	3 x 3gg	3 x 3gg	3 x 3gg
		Livellamento tratti saltuari di binario a mezzo CM	Aversa-Foggia	TRATTE Varie	N								3 x 3gg	3 x 3gg					
		Attività di ordinaria manutenzione da eseguirsi di notte				N						3 x 4gg			3 x 4gg				
		Totale notti previste nella settimana (tenendo conto anche delle attività di manutenzione ordinaria)				N	12	13	13	12	9	13	16	13	13	16	13	13	13
NAM3TE02	Zona TE Caserta	Risanamento tratti saltuari 1° e 2° binario in stazione di CASERTA (MSA)	Roma Napoli (via Cassino)	CASERTA	D	1 x 4gg	1 x 5gg												
		Sostituzione traverse (n.5000) con risanamento: SPARANISE-2°B°CE N. (MSA)	Roma Napoli (via Cassino)	SPARANISE-2°B°CE N.	N										2 x 5gg	2 x 5gg	2 x 5gg	2 x 5gg	
		Rinnovo 4+2 deviatoi in stazione di CASERTA(CM):18a, 106a, 6b/5, 4b/3;.12A/13B-29B/30A	Roma Napoli (via Cassino)	CASERTA	N									1 x 5gg	1 x 5gg	1 x 5gg	1 x 5gg	1 x 5gg	1 x 5gg
		RILEVATI CEDEVOLI Bin/PARI E ALCUNI TRATTI Bin/DISPARI	Roma Napoli AV/AC	PM TORA-PJ GRICIGNANO	N	2 x 4gg	2 x 5gg	2 x 5gg	2 x 4gg	2 x 4gg	2 x 4gg	2 x 4gg	2 x 4gg	2 x 4gg	2 x 4gg				
		Attività di ordinaria manutenzione da eseguirsi di notte				N	3 x 2gg	3 x 2gg		3 x 2gg	3 x 2gg	3 x 2gg		3 x 2gg	3 x 2gg	3 x 2gg	3 x 2gg	3 x 2gg	3 x 2gg
		Totale notti previste nella settimana (tenendo conto anche delle attività di manutenzione ordinaria)				N	14	16	10	14	14	14	8	19	19	21	21	15	15
NAM3TE08	Zona TE Rocca D'Ev.	RINNOVO TE VAIRANO-CAPUA	Roma Napoli (via Cassino)	VAIRANO	D	2 x 4gg	2 x 5gg	2 x 5gg	2 x 4gg	2 x 4gg	2 x 5gg	2 x 5gg	2 x 5gg	2 x 5gg	2 x 5gg	2 x 5gg	2 x 5gg	2 x 5gg	
		Sostituzione tratti di cavI in basso isolamento e blindatura tra Caserta e Cassino, C.A.n.31 del 23/7/2012	Roma Napoli (via Cassino)	CASSINO-ROCCA	D	2 x 4gg	2 x 5gg	2 x 5gg	2 x 4gg	2 x 4gg	2 x 5gg	2 x 5gg	2 x 5gg	2 x 5gg	2 x 5gg	2 x 5gg	2 x 5gg	2 x 5gg	2 x 5gg
		RINNOVO ARMAMENTO VAIRANO-MIGNANO	Roma Napoli (via Cassino)	VAIRANO-MIGNANO	D	2 x 4gg	2 x 5gg	2 x 5gg	2 x 4gg	2 x 4gg	2 x 5gg	2 x 5gg	2 x 5gg	2 x 5gg	2 x 5gg	2 x 5gg	2 x 5gg	2 x 5gg	2 x 5gg

Piano di attività UT Nord Est Caserta - II Trimestre 2013

CdL	Impianto	Descrizione	Linea (piano attività)	Tratta	Lavoro (N/D)	Numero Settimana														
						Aprile					Maggio				Giugno					
						14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26		
		Attività di ordinaria manutenzione da eseguirsi di notte			N	3 x 1gg	3 x 1gg		3 x 1gg	3 x 1gg	3 x 1gg		3 x 1gg	3 x 1gg	3 x 1gg	3 x 1gg				
		Totale notti previste nella settimana (tenendo conto anche delle attività di manutenzione ordinaria)			N	3	3	0	3	3	3	0	3	3	3	3	0	0		
NAM3TE16	Zona TE Vairano	RINNOVO TE VAIRANO-CAPUA	Roma Napoli (via Cassino)	CAPUA-SPARANISE	D	2 x 4gg	2 x 5gg	2 x 5gg	2 x 4gg	2 x 4gg	2 x 5gg	2 x 5gg	2 x 5gg	2 x 5gg	2 x 5gg	2 x 5gg	2 x 5gg	2 x 5gg		
		Sostituzione traverse (n.5000) con risanamento: SPARANISE-2°B°CE N. (MSA)	Roma Napoli (via Cassino)	SPARANISE-2°B°CE N.	N												2 x 5gg	2 x 5gg	2 x 5gg	2 x 5gg
		LAVORI AL P.S.A. DI VENAFRO	Roma Napoli (via Cassino)	VENAFRO	D	2 x 4gg	2 x 5gg													
		Rinnovo due deviatori 1a e 2a in stazione di SPARANISE (MSA)	Roma Napoli (via Cassino)	SPARANISE	N							1 x 5gg	1 x 5gg							
		STAZIONE DI PIGNATARO - REALIZZAZIONE DI UN NUOVO SOTTOPASSO PEDONALE	Roma Napoli (via Cassino)	PIGNATARO	N												2 x 2gg		2 x 2gg	
		STAZIONE DI CAPUA: REALIZZAZIONE DI UN NUOVO SOTTOPASSO PEDONALE	Roma Napoli (via Cassino)	CAPUA	D	1 x 1gg	1 x 1gg	1 x 1gg	1 x 1gg	1 x 1gg										
		Sistema rilevamento caduta veicoli "SIRIO"	Roma Napoli AV/AC	PM TORA-PJ GRICIGNANO	N														2 x 5gg	2 x 5gg
		Attività di ordinaria manutenzione da eseguirsi di notte			N	3 x 2gg	3 x 2gg		3 x 2gg	3 x 2gg	3 x 2gg			3 x 2gg	3 x 2gg	3 x 2gg	3 x 2gg	3 x 2gg		
				Totale notti previste nella settimana (tenendo conto anche delle attività di manutenzione ordinaria)			N	6	6	0	6	6	11	5	6	6	20	16	24	20
NAM3TE15	Zona TE Teles	DOWN SIZING: VARIE STAZIONI	Aversa-Foggia	STAZIONI VARIE (Pianerottolo; Paduli; R. di S. Maria)	N							2 x 4gg	2 x 4gg	2 x 4gg						
		Livellamento tratti saltuari di binario a mezzo CM	Aversa-Foggia	TRATTE Varie	N	2 x 3gg	2 x 4gg	2 x 4gg												
		Risanamenro massicciata galleria Colle Limata	Aversa-Foggia	TELESE	N											2 x 4gg	2 x 4gg	2 x 4gg	2 x 4gg	
		Attività di ordinaria manutenzione da eseguirsi di notte			N	3 x 2gg	3 x 2gg	3 x 2gg	3 x 2gg	3 x 2gg	3 x 2gg	3 x 2gg	3 x 2gg	3 x 2gg	3 x 2gg	3 x 2gg	3 x 2gg	3 x 2gg	3 x 2gg	
				Totale notti previste nella settimana (tenendo conto anche delle attività di manutenzione ordinaria)			N	12	14	14	6	6	6	14	14	14	14	14	14	14
NAM3TE18	Zona TE Savignano	Raddoppio Cervaro-Bovino	Aversa-Foggia	CERVARO-BOVINO	N	2 x 3gg	2 x 4gg	2 x 4gg	2 x 3gg	2 x 3gg	2 x 4gg	2 x 4gg	2 x 4gg	2 x 4gg	2 x 4gg	2 x 4gg	2 x 4gg	2 x 4gg		
		DOWN SIZING: VARIE STAZIONI	Aversa-Foggia	STAZIONI VARIE (Pianerottolo; Paduli; R. di S. Maria)	N	2 x 3gg	2 x 3gg	2 x 3gg	2 x 3gg	2 x 2gg	2 x 3gg	2 x 4gg	2 x 4gg	2 x 4gg		2 x 3gg	2 x 3gg	2 x 3gg		
		Livellamento tratti saltuari di binario a mezzo CM	Aversa-Foggia	TRATTE Varie	N				2 x 3gg	2 x 3gg	2 x 4gg		2 x 3gg	2 x 3gg						
		Attività di ordinaria manutenzione da eseguirsi di notte			N															
				Totale notti previste nella settimana (tenendo conto anche delle attività di manutenzione ordinaria)			N	12	14	14	18	16	22	16	22	22	8	14	14	14

Piano di attività UT Nord Est Caserta - II Trimestre 2013

Previsione di massima delle attività eseguite di notte

	CdL	Aprile				Maggio				Giugno				Apr.	Mag.	Giù.		
		15	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	Tot.	Tot.	Tot.	
Impegno personale n° totale agenti per notti per settimana e per mese LINEA CASERTA-CASSINO	Sostituzione traverse (n.5000) con risanamento: SPARANISE-2°B°CE N. (MSA)																	240
	NAM3LV23											10	10	10	10			40
	NAM3IS20											10	10	10	10			40
	NAM3TE16											10	10	10	10			40
	NAM3LV22											10	10	10	10			40
	NAM3IS23											10	10	10	10			40
	NAM3TE02											10	10	10	10			40
	Rinnovo due deviatoi 1a e 2a in stazione di SPARANISE (MSA)																40	
	NAM3LV23						10	10									20	
	NAM3IS20						5	5									10	
	NAM3TE16						5	5									10	
	Rinnovo 4+2 deviatoi in stazione di CASERTA(CM):18a, 106a, 6b/5, 4b/3,12A/13B-29B/30A																40	80
	NAM3LV22								10	10	10	10	10	10		20	40	
	NAM3IS23								5	5	5	5	5	5		10	20	
	NAM3TE02								5	5	5	5	5	5		10	20	
	STAZIONE DI PIGNATARO - REALIZZAZIONE DI UN NUOVO SOTTOPASSO PEDONALE																	32
	NAM3LV23											5	5	5	5			20
	NAM3IS20											2		2			4	
	NAM3TE16											4		4			8	

Piano di attività UT Nord Est Caserta - II Trimestre 2013

Previsione di massima delle attività eseguite di notte

	CdL	Aprile					Maggio					Giugno				Apr.	Mag.	Giù.
		15	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	Tot.	Tot.	Tot.	
		RILEVATI CEDEVOLI Bin/PARI E ALCUNI TRATTI Bin/DISPARI														198	144	
Impegno personale n° totale agenti per notti per settimana e per mese LINEA AV/AC ROMA-NAPOLI	NAM3LV22	20	25	25	20	20	20	20	20	20					110	80		
	NAM3IS23	8	10	10	8	8	8	8	8	8					44	32		
	NAM3TE02	8	10	10	8	8	8	8	8	8					44	32		
	MOLATURA ROTAIE														62	13		
	NAM3LV22					20	10								20	10		
	NAM3LV23			10	8										18			
	NAM3LV04	8	10												18			
	NAM3IS23						3									3		
	NAM3IS20			3											3			
	NAM3IS22		3												3			
	Sistema rilevamento caduta veicoli "SIRIO"																50	
	NAM3LV23												10	10	10			30
	NAM3TE16													10	10			20

Piano di attività UT Nord Est Caserta - II Trimestre 2013

Previsione di massima delle attività eseguite di notte

	CdL	Aprile				Maggio				Giugno				Apr.	Mag.	Giù.	
		15	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	Tot.	Tot.	Tot.
		Raddoppio Cervaro-Bovino														51	48
	NAM3LV21	3	4	4	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	17	16	16
	NAM3TE18	6	8	8	6	6	8	8	8	8	8	8	8	8	34	32	32
DOWN SIZING: VARIE STAZIONI														126	159	45	
	NAM3LV18						12	12	12							36	
	NAM3LV21	9	9	9	9	6	9				9	9	9	42	9	27	
	NAM3IS15	6	6	6	6	4	6	8	8	8				28	30		
	NAM3IS17							8	8	8					24		
	NAM3IS19	6	6	6	6	4	6							28	6		
	NAM3TE15							8	8	8					24		
	NAM3TE18	6	6	6	6	4	6	8	8	8		6	6	28	30	18	
Livellamento tratti saltuari di binario a mezzo CM														85	50		
	NAM3LV16	9	12	12										33			
	NAM3LV18				9	9	12							18	12		
	NAM3LV21							9	9						18		
	NAM3TE15	6	8	8										22			
	NAM3TE18				6	6	8		6	6				12	20		
Risanamento massicciata galleria Colle Limata																80	
	NAM3LV16										12	12	12	12			48
	NAM3TE15										8	8	8	8			32

Impegno personale n° totale agenti per notti per settimana e per mese
LINEA CASERTA-FOGGIA

Piano di attività UT Nord Est Caserta - II Trimestre 2013

Previsione di massima delle attività eseguite di notte

	CdL	Aprile				Maggio				Giugno				Apr.	Mag.	Giù.	
		15	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	Tot.	Tot.	Tot.
		Attività di ordinaria manutenzione da eseguirsi di notte														274	229
Impegno personale n° totale agenti per notti per settimana e per mese Linea AV/AC ROMA-NAPOLI Linea CASERTA-FOGGIA	NAM3IS20	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	30	24	24
	NAM3IS22	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	15	12	12
	NAM3IS23	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	30	24	24
	NAM3IS15	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	20	16	16
	NAM3LV04	2	2		2	4	2			2	2	4		2	10	4	8
	NAM3LV22	2	2		2	4	2			2	2	4		2	10	4	8
	NAM3LV23	2	2		2	2	2			2	2	2		2	8	4	6
	NAM3LV16	12		16		9	12		12	12		12	12	12	37	36	36
	NAM3LV18	12		12			12			12				12	24	24	12
	NAM3LV21							12			12					12	12
	NAM3TE02	6	6		6	6	6		6	6	6	6			24	18	12
	NAM3TE08	3	3		3	3	3		3	3	3	3			12	9	6
	NAM3TE16	6	6		6	6	6		6	6	6	6			24	18	12
	NAM3TE15	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	30	24	24

Piano di attività UT Nord Est Caserta - II Trimestre 2013

Previsione di massima delle attività eseguite di notte

	CdL	Previsione di massima delle attività eseguite di notte																Apr.	Mag.	Giu.	
		Aprile					Maggio					Giugno				Tot.	Tot.				Tot.
		15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	Tot.	Tot.	Tot.					
Impegno medio notti per agente	NAM3IS20	Zona IS Vairano	Tot. notti	6	6	9	6	6	11	11	6	6	18	16	18	16	33	34	68		
		Agenti utilizzabili in lavori notturni n°	Media agente	0,4	0,4	0,6	0,4	0,4	0,7	0,7	0,4	0,4	1,1	1,0	1,1	1,0	2,1	2,1	4,3		
	NAM3IS22	Zona IS Rocca D'Ev.	Tot. notti	3	6	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	18	12	12		
		Agenti utilizzabili in lavori notturni n°	Media agente	0,2	0,5	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	1,4	0,9	0,9		
	NAM3IS23	Zona IS S. Maria C.V.	Tot. notti	14	16	16	14	14	17	14	19	19	21	21	21	21	74	69	84		
		Agenti utilizzabili in lavori notturni n°	Media agente	1,1	1,2	1,2	1,1	1,1	1,3	1,1	1,5	1,5	1,6	1,6	1,6	1,6	5,7	5,3	6,5		
	NAM3IS15	Zona IS Telesse	Tot. notti	10	10	10	10	8	10	12	12	12	4	4	4	4	48	46	16		
		Agenti utilizzabili in lavori notturni n°	Media agente	0,9	0,9	0,9	0,9	0,7	0,9	1,1	1,1	1,1	0,4	0,4	0,4	0,4	4,4	4,2	1,5		
	NAM3IS17	Zona IS Benevento	Tot. notti							8	8	8							24		
		Agenti utilizzabili in lavori notturni n°	Media agente	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,1	1,1	1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,4	0,0		
	NAM3IS19	Zona IS Savignano	Tot. notti	6	6	6	6	4	6									28	6		
		Agenti utilizzabili in lavori notturni n°	Media agente	0,6	0,6	0,6	0,6	0,4	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,8	0,6	0,0		
	NAM3LV04	Tronco LV Rocca D'Ev.	Tot. notti	10	12		2	4	2			2	2	4		2	28	4	8		
		Agenti utilizzabili in lavori notturni n°	Media agente	0,7	0,9	0,0	0,1	0,3	0,1	0,0	0,0	0,1	0,1	0,3	0,0	0,1	2,0	0,3	0,6		
	NAM3LV22	Tronco LV Capua	Tot. notti	22	27	25	22	44	32	20	30	32	22	24	20	22	140	114	88		
		Agenti utilizzabili in lavori notturni n°	Media agente	1,4	1,7	1,6	1,4	2,8	2,0	1,3	1,9	2,0	1,4	1,5	1,3	1,4	8,8	7,1	5,5		
	NAM3LV23	Tronco LV Vairano	Tot. notti	2	2	10	10	2	12	10		2	17	27	25	27	26	24	96		
		Agenti utilizzabili in lavori notturni n°	Media agente	0,1	0,1	0,7	0,7	0,1	0,8	0,7	0,0	0,1	1,1	1,8	1,7	1,8	1,7	1,6	6,4		
	NAM3LV16	Tronco LV Telesse	Tot. notti	21	12	28		9	12		12	12	12	24	24	24	70	36	84		
		Agenti utilizzabili in lavori notturni n°	Media agente	1,9	1,1	2,5	0,0	0,8	1,1	0,0	1,1	1,1	1,1	2,2	2,2	2,2	6,4	3,3	7,6		
	NAM3LV18	Tronco LV Benevento	Tot. notti	12		12	9	9	24	12	12	24				12	42	72	12		
		Agenti utilizzabili in lavori notturni n°	Media agente	0,9	0,0	0,9	0,6	0,6	1,7	0,9	0,9	1,7	0,0	0,0	0,0	0,9	3,0	5,1	0,9		
	NAM3LV21	Tronco LV Savignano	Tot. notti	12	13	13	12	9	13	16	13	13	16	13	13	13	59	55	55		
		Agenti utilizzabili in lavori notturni n°	Media agente	2,0	2,2	2,2	2,0	1,5	2,2	2,7	2,2	2,2	2,7	2,2	2,2	2,2	9,8	9,2	9,2		
	NAM3TE02	Zona TE Caserta	Tot. notti	14	16	10	14	14	14	8	19	19	21	21	15	15	68	60	72		
		Agenti utilizzabili in lavori notturni n°	Media agente	1,4	1,6	1,0	1,4	1,4	1,4	0,8	1,9	1,9	2,1	2,1	1,5	1,5	6,8	6,0	7,2		
	NAM3TE08	Zona TE Rocca D'Ev.	Tot. notti	3	3		3	3	3		3	3	3	3			12	9	6		
		Agenti utilizzabili in lavori notturni n°	Media agente	0,3	0,3	0,0	0,3	0,3	0,3	0,0	0,3	0,3	0,3	0,3	0,0	0,0	1,1	0,8	0,5		
	NAM3TE16	Zona TE Vairano	Tot. notti	6	6		6	6	11	5	6	6	20	16	24	20	24	28	80		
		Agenti utilizzabili in lavori notturni n°	Media agente	0,5	0,5	0,0	0,5	0,5	0,8	0,4	0,5	0,5	1,5	1,2	1,8	1,5	1,8	2,2	6,2		
NAM3TE15	Zona TE Telesse	Tot. notti	12	14	14	6	6	6	14	14	14	14	14	14	14	52	48	56			
	Agenti utilizzabili in lavori notturni n°	Media agente	1,0	1,2	1,2	0,5	0,5	0,5	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	4,3	4,0	4,7			
NAM3TE18	Zona TE Savignano	Tot. notti	12	14	14	18	16	22	16	22	22	8	14	14	14	74	82	50			
	Agenti utilizzabili in lavori notturni n°	Media agente	1,1	1,3	1,3	1,6	1,5	2,0	1,5	2,0	2,0	0,7	1,3	1,3	1,3	6,7	7,5	4,5			

Piano di attività UT SE SALERNO - 2 Trimestre 2013

WBS	Descrizione	Linea (piano attività)	Tratta	Risorse	Lavoro (N/D)	Numero Settimana												Note		
						Aprile					Maggio				Giugno					
						14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25		26	
	ACCORDO QUADRO TE Rinnovo della linea di contatto tra S.Giovanni Barra - Torre C.Le	Napoli-Battipaglia	Torre Centrale-San Giovanni Barra	NAM2TE09	N	3 x 5gg	3 x 5gg	3 x 5gg	3 x 5gg	3 x 5gg	3 x 5gg	3 x 5gg	3 x 5gg	3 x 5gg	3 x 5gg	3 x 5gg	3 x 5gg			
NAM2LV10				N		1 x 5gg	1 x 5gg	1 x 5gg	1 x 5gg	1 x 5gg	1 x 5gg	1 x 5gg	1 x 5gg	1 x 5gg						
Interr. P/D				N	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	
	Lavori di Armamento MSA rightsizing SCAFFATI, ANGRÌ, NOCERA INF.	Napoli-Battipaglia	Torre-Bivio Santa Lucia	NAM2LV11	N		3 x 5gg	3 x 5gg	3 x 5gg	3 x 5gg	3 x 5gg	3 x 5gg	3 x 5gg	3 x 5gg						
NAM2TE09				N		1 x 5gg	1 x 5gg	1 x 5gg	1 x 5gg	1 x 5gg	1 x 5gg	1 x 5gg	1 x 5gg	1 x 5gg						
Interr. Bin. Staz.				N		5	5	5	5	5	5	5	5	5	5					
	Messa in sicurezza Galleria Santa Lucia	Napoli-Battipaglia	Bivio Santa Lucia-Salerno	NAM2LV13	N	1 x 5gg	1 x 5gg	1 x 5gg	1 x 5gg	1 x 5gg	1 x 5gg	1 x 5gg	1 x 5gg	1 x 5gg	1 x 5gg	1 x 5gg	1 x 5gg	1 x 5gg		
NAM2TE12				N	1 x 5gg	1 x 5gg	1 x 5gg	1 x 5gg	1 x 5gg	1 x 5gg	1 x 5gg	1 x 5gg	1 x 5gg	1 x 5gg	1 x 5gg	1 x 5gg	1 x 5gg	1 x 5gg		
NAM2TE14				N	1 x 5gg	1 x 5gg	1 x 5gg	1 x 5gg	1 x 5gg	1 x 5gg	1 x 5gg	1 x 5gg	1 x 5gg	1 x 5gg	1 x 5gg	1 x 5gg	1 x 5gg	1 x 5gg	1 x 5gg	
Interr. Bin. Staz.				N	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	
	Lavori di risanamento PL km 64+366 a Pontecagnano	Napoli-Battipaglia	Stazione di Pontecagnano	NAM2LV13	N		2 x 2gg													
NAM2TE14				N		1 x 2gg														
Interr. P/D				N		2														
	Copertura trincerone ferroviario Comune di Salerno	Napoli-Battipaglia	Stazione di Salerno	NAM2LV13	N	1 x 5gg	1 x 1gg													
NAM2TE12				N	1 x 5gg	1 x 1gg														
Interr. P/D				N	5	1														
	Lavori di realizzazione sottovia al km 53 stazione di Salerno conto Comune di Salerno	Napoli-Battipaglia	Stazione di Salerno	NAM2LV13	N						3 x 3gg									
NAM2TE12				N						2 x 3gg										
NAM2IS12				N						3 x 1gg										
Interr. P/D				N						3										
	Rinnovo deviatoi 1a e 1b e demolizione deviatoi 2a e 2b a Pontecagnano nonché rinnovo deviatoi 22 a Battipaglia	Napoli-Battipaglia	Stazione di Pontecagnano e Battipaglia	NAM2LV13	N	2 x 3gg	2 x 3gg	2 x 3gg	2 x 3gg											
NAM2LV14				N	1 x 3gg	1 x 3gg	1 x 3gg	1 x 3gg		4 x 3gg										
NAM2TE12				N	1 x 3gg	1 x 3gg	1 x 1gg			2 x 3gg										
NAM2IS12				N	4 x 1gg	4 x 1gg				4 x 1gg										
NAM2TE14				N	3 x 1gg	3 x 1gg	2 x 1gg	2 x 1gg		2 x 2gg										

Piano di attività UT SE SALERNO - 2 Trimestre 2013

WBS	Descrizione	Linea (piano attività)	Tratta	Risorse	Lavoro (N/D)	Numero Settimana												Note		
						Aprile					Maggio				Giugno					
						14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25		26	
				Interr. P/D	N	3	3	3	3		3									
	Manutenzione TE ordinaria e straordinaria tratta PC Vesuvio-Bivio Santa Lucia	LMV	PC Vesuvio-Bivio Santa Lucia	NAM2TE11	N	3 x 2gg	3 x 2gg	3 x 2gg	3 x 2gg	3 x 2gg	3 x 2gg	3 x 2gg	3 x 2gg	3 x 2gg	3 x 2gg	3 x 2gg	3 x 2gg	3 x 2gg		
				N																
				N																
Interr. P/D				N	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2

Piano di attività UT SE SALERNO - 2 Trimestre 2013

WBS	Descrizione	Linea (piano attività)	Tratta	Risorse	Lavoro (N/D)	Numero Settimana												Note	
						Aprile				Maggio				Giugno					
						14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25		26
	Lavori MSA ricambio traverse 1 e 2 binario stazione di Salerno	Napoli-Battipaglia	Stazione di Salerno	NAM2LV13	N		1 x 5gg	1 x 5gg	1 x 5gg	1 x 5gg	1 x 5gg	1 x 5gg	1 x 5gg	1 x 5gg					
NAM2LV14				N		2 x 5gg	2 x 5gg	2 x 5gg	2 x 5gg	2 x 5gg	2 x 5gg	2 x 5gg	2 x 5gg	2 x 5gg					
NAM2TE14				N		1 x 5gg	1 x 5gg	1 x 5gg	1 x 5gg	1 x 5gg	1 x 5gg	1 x 5gg	1 x 5gg	1 x 5gg	1 x 5gg				
NAM2IS12				N		2 x 3gg	2 x 3gg	2 x 3gg	2 x 3gg	2 x 3gg	2 x 3gg	2 x 3gg	2 x 3gg	2 x 3gg	2 x 3gg				
NAM2TE12				N		1 x 5gg	1 x 5gg	1 x 5gg	1 x 5gg	1 x 5gg	1 x 5gg	1 x 5gg	1 x 5gg	1 x 5gg	1 x 5gg	1 x 5gg			
Interr. P/D				N		5	5	5	5	5	5	5	5	5	5				
	Lavori di realizzazione GSMR sulla LMV - ITALFERR	LMV	PC Vesuvio-Bivio Sarno	NAM2TE11	N	1 x 3gg	1 x 3gg	1 x 3gg	1 x 3gg	1 x 3gg	1 x 3gg	1 x 3gg	1 x 3gg	1 x 3gg	1 x 3gg	1 x 3gg	1 x 3gg		
NAM2LV12					1 x 3gg	1 x 3gg	1 x 3gg	1 x 3gg	1 x 3gg	1 x 3gg	1 x 3gg	1 x 3gg	1 x 3gg	1 x 3gg	1 x 3gg	1 x 3gg	1 x 3gg		
Interr. P/D				N	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	

Piano di attività UT SE SALERNO - 2 Trimestre 2013

CdL	Impianto	Descrizione	Linea (piano attività)	Tratta	Lavoro (N/D)	Numero Settimana												
						Aprile					Maggio				Giugno			
						14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
NAM1IS09	Zona IS Torre c.le	Attività di ordinaria manutenzione da eseguirsi di notte		N														
		Totale notti previste nella settimana (tenendo conto anche delle attività di manutenzione ordinaria)		N	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
NAM1IS10	Zona IS Nocera	Attività di ordinaria manutenzione da eseguirsi di notte		N														
		Totale notti previste nella settimana (tenendo conto anche delle attività di manutenzione ordinaria)		N	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
NAM1IS12	Zona IS Salerno	Lavori di realizzazione sottovia al km 53 stazione di Salerno conto Comune di Salerno	Napoli-Battipaglia	Stazione di Salerno	N						3 x 1gg							
		Rinnovo deviatoi 1a e 1b e demolizione deviatoi 2a e 2b a Pontecagnano nonché rinnovo deviatoio 22 a Battipaglia	Napoli-Battipaglia	Stazione di Pontecagnano e Battipaglia	N	4 x 1gg	4 x 1gg				4 x 1gg							
		Lavori MSA ricambio traverse 1 e 2 binario stazione di Salerno	Napoli-Battipaglia	Stazione di Salerno	N		2 x 3gg	2 x 3gg	2 x 3gg	2 x 3gg	2 x 3gg	2 x 3gg	2 x 3gg	2 x 3gg	2 x 3gg			
		Attività di ordinaria manutenzione da eseguirsi di notte		N														
		Totale notti previste nella settimana (tenendo conto anche delle attività di manutenzione ordinaria)		N	4	10	6	6	6	9	10	6	6	6	6	0	0	0
NAM1IS13	Zona IS Battipaglia	Attività di ordinaria manutenzione da eseguirsi di notte		N														
		Totale notti previste nella settimana (tenendo conto anche delle attività di manutenzione ordinaria)		N	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Attività di ordinaria manutenzione da eseguirsi di notte		N														
		Totale notti previste nella settimana (tenendo conto anche delle attività di manutenzione ordinaria)		N	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Piano di attività UT SE SALERNO - 2 Trimestre 2013

CdL	Impianto	Descrizione	Linea (piano attività)	Tratta	Lavoro (N/D)	Numero Settimana													
						Aprile					Maggio				Giugno				
						14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	
NAM1LV10	Tronco LV Torre C.le	ACCORDO QUADRO TE Rinnovo della linea di contatto tra S.Giovanni Barra - Torre C.Le	Napoli-Battipaglia	Torre Centrale-San Giovanni Barra	N		1 x 5gg	1 x 5gg	1 x 5gg	1 x 5gg	1 x 5gg	1 x 5gg	1 x 5gg	1 x 5gg					
		Attività di ordinaria manutenzione da eseguirsi di notte			N														
		Totale notti previste nella settimana (tenendo conto anche delle attività di manutenzione ordinaria)			N	0	5	5	5	5	5	5	5	5	5	0	0	0	
NAM1LV11	Tronco LV Nocera Inf.	Lavori di Armamento MSA rightsizing SCAFATI, ANGRI, NOCERA INF:	Napoli-Battipaglia	Torre-Bivio Santa Lucia	N		3 x 5gg	3 x 5gg	3 x 5gg	3 x 5gg	3 x 5gg	3 x 5gg	3 x 5gg	3 x 5gg					
		Attività di ordinaria manutenzione da eseguirsi di notte			N														
		Totale notti previste nella settimana (tenendo conto anche delle attività di manutenzione ordinaria)			N	0	15	15	15	15	15	15	15	15	15	0	0	0	
NAM1LV12	Tronco LV Sarno	Lavori di realizzazione GSMR sulla LMV -ITALFERR	LMV	PC Vesuvio-Bivio Sarno	N	1 x 3gg	1 x 3gg	1 x 3gg	1 x 3gg	1 x 3gg	1 x 3gg	1 x 3gg	1 x 3gg	1 x 3gg	1 x 3gg	1 x 3gg	1 x 3gg		
		Attività di ordinaria manutenzione da eseguirsi di notte			N														
		Totale notti previste nella settimana (tenendo conto anche delle attività di manutenzione ordinaria)			N	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	
NAM1LV13	Tronco LV Salerno	Messa in sicurezza Galleria Santa Lucia	Napoli-Battipaglia	Biavio Santa Lucia-Salerno	N	1 x 5gg	1 x 5gg	1 x 5gg	1 x 5gg	1 x 5gg	1 x 5gg	1 x 5gg	1 x 5gg	1 x 5gg	1 x 5gg	1 x 5gg	1 x 5gg		
		Lavori di risanamento PL km 64+366 a Pontecagnano	Napoli-Battipaglia	Stazione di Pontecagnano	N		2 x 2gg												
		Copertura trincerone ferroviario Comune di Salerno	Napoli-Battipaglia	Stazione di Salerno	N	1 x 5gg	1 x 1gg												
		Lavori di realizzazione sottovia al km 53 stazione di Salerno conto Comune di Salerno	Napoli-Battipaglia	Stazione di Salerno	N						3 x 3gg								
		Rinnovo deviatoi 1a e 1b e demolizione deviatoi 2a e 2b a Pontecagnano nonché rinnovo deviatoio 22 a Battipaglia	Napoli-Battipaglia	Stazione di Pontecagnano e Battipaglia	N	2 x 3gg	2 x 3gg	2 x 3gg	2 x 3gg										
		Lavori MSA ricambio traverse 1 e 2 binario stazione di Salerno	Napoli-Battipaglia	Stazione di Salerno	N		1 x 5gg	1 x 5gg	1 x 5gg	1 x 5gg	1 x 5gg	1 x 5gg	1 x 5gg	1 x 5gg	1 x 5gg				
		Attività di ordinaria manutenzione da eseguirsi di notte			N														
		Totale notti previste nella settimana (tenendo conto anche delle attività di manutenzione ordinaria)			N	16	21	16	16	10	19	10	10	10	10	5	5	5	
NAM1LV14	Tronco LV Battipaglia	Rinnovo deviatoi 1a e 1b e demolizione deviatoi 2a e 2b a Pontecagnano nonché rinnovo deviatoio 22 a Battipaglia	Napoli-Battipaglia	Stazione di Pontecagnano e Battipaglia	N	1 x 3gg	1 x 3gg	1 x 3gg	1 x 3gg		4 x 3gg								
		Lavori MSA ricambio traverse 1 e 2 binario stazione di Salerno	Napoli-Battipaglia	Stazione di Salerno	N		2 x 5gg	2 x 5gg	2 x 5gg	2 x 5gg	2 x 5gg	2 x 5gg	2 x 5gg	2 x 5gg					
		Attività di ordinaria manutenzione da eseguirsi di notte			N														
		Totale notti previste nella settimana (tenendo conto anche delle attività di manutenzione ordinaria)			N	3	13	13	13	10	22	10	10	10	10	0	0	0	
	Tronco LV Baragiano	Attività di ordinaria manutenzione da eseguirsi di notte			N														
		Totale notti previste nella settimana (tenendo conto anche delle attività di manutenzione ordinaria)			N	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

Piano di attività UT SE SALERNO - 2 Trimestre 2013

CdL	Impianto	Descrizione	Linea (piano attività)	Tratta	Lavoro (N/D)	Numero Settimana													
						Aprile					Maggio				Giugno				
						14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	
NAMITE09	Zona TE Torre C.le	ACCORDO QUADRO TE Rinnovo della linea di contatto tra S.Giovanni Barra - Torre C.Le	Napoli-Battipaglia	Torre Centrale-San Giovanni Barra	N	3 x 5gg	3 x 5gg	3 x 5gg	3 x 5gg	3 x 5gg	3 x 5gg	3 x 5gg	3 x 5gg	3 x 5gg	3 x 5gg	3 x 5gg	3 x 5gg		
		Lavori di Armamento MSA rightsizing SCAFIATI, ANGRI, NOCERA INF.	Napoli-Battipaglia	Torre-Bivio Santa Lucia	N		1 x 5gg	1 x 5gg	1 x 5gg	1 x 5gg	1 x 5gg	1 x 5gg	1 x 5gg	1 x 5gg	1 x 5gg				
		Attività di ordinaria manutenzione da eseguirsi di notte				N													
		Totale notti previste nella settimana (tenendo conto anche delle attività di manutenzione ordinaria)				N	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
NAMITE11	Zona TE Sarno	Manutenzione TE ordinaria e straordinaria tratta PC Vesuvio-Bivio Santa Lucia	LMV	PC Vesuvio-Bivio Santa Lucia	N	3 x 2gg	3 x 2gg	3 x 2gg	3 x 2gg	3 x 2gg	3 x 2gg	3 x 2gg	3 x 2gg	3 x 2gg	3 x 2gg	3 x 2gg	3 x 2gg		
		Lavori di realizzazione GSMR sulla LMV -ITALFERR	LMV	PC Vesuvio-Bivio Sarno	N	1 x 3gg	1 x 3gg	1 x 3gg	1 x 3gg	1 x 3gg	1 x 3gg	1 x 3gg	1 x 3gg	1 x 3gg	1 x 3gg	1 x 3gg	1 x 3gg		
		Attività di ordinaria manutenzione da eseguirsi di notte				N													
		Totale notti previste nella settimana (tenendo conto anche delle attività di manutenzione ordinaria)				N	15	20	20	20	20	20	20	20	20	15	15	15	
NAMITE12	Zona TE Salerno	Copertura trincerone ferroviario Comune di Salerno	Napoli-Battipaglia	Stazione di Salerno	N	1 x 5gg	1 x 1gg												
		Lavori di realizzazione sottovia al km 53 stazione di Salerno conto Comune di Salerno	Napoli-Battipaglia	Stazione di Salerno	N						2 x 3gg								
		Rinnovo deviatoi 1a e 1b e demolizione deviatoi 2a e 2b a Pontecagnano nonché rinnovo deviatoio 22 a Battipaglia	Napoli-Battipaglia	Stazione di Pontecagnano e Battipaglia	N	1 x 3gg	1 x 3gg	1 x 1gg			2 x 3gg								
		Lavori MSA ricambio traverse 1 e 2 binario stazione di Salerno	Napoli-Battipaglia	Stazione di Salerno	N		1 x 5gg	1 x 5gg	1 x 5gg	1 x 5gg	1 x 5gg	1 x 5gg	1 x 5gg	1 x 5gg	1 x 5gg	1 x 5gg	1 x 5gg		
		Messa in sicurezza Galleria Santa Lucia	Napoli-Battipaglia	Biavio Santa Lucia-Salerno	N	1 x 5gg	1 x 5gg	1 x 5gg	1 x 5gg	1 x 5gg	1 x 5gg	1 x 5gg	1 x 5gg	1 x 5gg	1 x 5gg	1 x 5gg	1 x 5gg		
		Attività di ordinaria manutenzione da eseguirsi di notte				N													
Totale notti previste nella settimana (tenendo conto anche delle attività di manutenzione ordinaria)				N	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9			
NAMITE14	Zona TE Baragiano	Rinnovo deviatoi 1a e 1b e demolizione deviatoi 2a e 2b a Pontecagnano nonché rinnovo deviatoio 22 a Battipaglia	Napoli-Battipaglia	Stazione di Pontecagnano e Battipaglia	N	3 x 1gg	3 x 1gg	2 x 1gg	2 x 1gg		2 x 2gg								
		Lavori MSA ricambio traverse 1 e 2 binario stazione di Salerno	Napoli-Battipaglia	Stazione di Salerno	N		1 x 5gg	1 x 5gg	1 x 5gg	1 x 5gg	1 x 5gg	1 x 5gg	1 x 5gg	1 x 5gg	1 x 5gg	1 x 5gg			
		Lavori di risanamento PL km 64+366 a Pontecagnano	Napoli-Battipaglia	Stazione di Pontecagnano	N		1 x 2gg												
		Messa in sicurezza Galleria Santa Lucia	Napoli-Battipaglia	Biavio Santa Lucia-Salerno	N	1 x 5gg	1 x 5gg	1 x 5gg	1 x 5gg	1 x 5gg	1 x 5gg	1 x 5gg	1 x 5gg	1 x 5gg	1 x 5gg	1 x 5gg			
		Attività di ordinaria manutenzione da eseguirsi di notte				N													
Totale notti previste nella settimana (tenendo conto anche delle attività di manutenzione ordinaria)				N	15	16	12	11	10	22	10	10	10	10	5	5	5		

Piano di attività UT SE SALERNO - 2 Trimestre 2013

Previsione di massima delle attività eseguite di notte

Impegno personale n° totale agenti per notti per settimana e per mese

	CdL	Aprile					Maggio					Giugno				Apr.	Mag.	Giù.
		14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	Tot.	Tot.	Tot.	
ACCORDO QUADRO TE Rinnovo della linea di contatto tra S.Giovanni Barra - Torre C.Le															95	80	65	
NAM1LV10		5	5	5	5	5	5	5	5	5				20	20	5		
NAM1TE09	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	75	60	60		
Lavori di Armamento MSA rightsizing SCAFATI, ANGRI, NOCERA INF:															80	80	20	
NAM1LV11		15	15	15	15	15	15	15	15	15				60	60	15		
NAM1TE09		5	5	5	5	5	5	5	5	5				20	20	5		
Messa in sicurezza Galleria Santa Lucia															75	60	60	
NAM1LV13	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	25	20	20		
NAM1TE12	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	25	20	20		
NAM1TE14	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	25	20	20		
Lavori di risanamento PL km 64+366 a Pontecagnano															6			
NAM1LV13		4												4				
NAM1TE14		2												2				
Copertura trincerone ferroviario Comune di Salerno															6			
NAM1LV13	5	1												6				
NAM1TE12	5	1																
Lavori di realizzazione sottovia al km 53 stazione di Salerno conto Comune di Salerno																18		
NAM1IS12						3									3			
NAM1LV13						9									9			
NAM1TE12						6									6			
Rinnovo deviatoi 1a e 1b e demolizione deviatoi 2a e 2b a Pontecagnano nonché rinnovo deviatooio 22 a Battipaglia															18	8		
NAM1IS12	4	4					4							8	4			
NAM1LV13	6	6	6	6														
NAM1LV14	3	3	3	3		12												
NAM1TE12	5	5	2	1		6												
NAM1TE14	3	3	2	2		4								10	4			
Manutenzione TE ordinaria e straordinaria tratta PC Vesuvio-Bivio Santa Lucia															30	24	24	
NAM1TE11	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	30	24	24		
Lavori MSA ricambio traverse 1 e 2 binario stazione di Salerno															124	124	31	
NAM1IS12		6	6	6	6	6	6	6	6	6				24	24	6		
NAM1LV13		5	5	5	5	5	5	5	5	5				20	20	5		
NAM1LV14		10	10	10	10	10	10	10	10	10				40	40	10		
NAM1TE12		5	5	5	5	5	5	5	5	5				20	20	5		
NAM1TE14		5	5	5	5	5	5	5	5	5				20	20	5		
Lavori di realizzazione GSMR sulla LMV -ITALFERR															30	24	24	
NAM1LV12	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	15	12	12		
NAM1TE11	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	15	12	12		

Piano di attività UT SE SALERNO - 2 Trimestre 2013

Previsione di massima delle attività eseguite di notte

	CdL	Aprile					Maggio				Giugno				Apr.	Mag.	Giu.
		14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	Tot.	Tot.	Tot.
		Attività di ordinaria manutenzione da eseguirsi di notte															
Impegno personale n° totale agenti per notti per settimana e per mese	NAM1IS09																
	NAM1IS10																
	NAM1IS12																
	NAM1IS13																
	NAM1IS21																
	NAM1LV10																
	NAM1LV11																
	NAM1LV12																
	NAM1LV13																
	NAM1LV14																
	NAM1LV15																
	NAM1TE09																
	NAM1TE11																
	NAM1TE12																
NAM1TE14																	

Piano di attività UT SE SALERNO - 2 Trimestre 2013

Previsione di massima delle attività eseguite di notte

		CdL	Aprile					Maggio					Giugno				Apr.	Mag.	Giù.
			14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	Tot.	Tot.	Tot.	
Impegno medio notti per agente	NAM1IS09	Tot. notti																	
	Agenti utilizzabili in lavori notturni n°	Media agente	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
	NAM1IS10	Tot. notti																	
	Agenti utilizzabili in lavori notturni n°	Media agente	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
	NAM1IS12	Tot. notti	4	10	6	6	6	9	10	6	6	6				32,00	31,00	6,00	
	Agenti utilizzabili in lavori notturni n°	Media agente	0,5	1,3	0,8	0,8	0,8	1,1	1,3	0,8	0,8	0,8	0,8	0,0	0,0	0,0	4,00	3,88	0,75
	NAM1IS13	Tot. notti																	
	Agenti utilizzabili in lavori notturni n°	Media agente	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
	NAM1IS21	Tot. notti																	
	Agenti utilizzabili in lavori notturni n°	Media agente	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
	NAM1LV10	Tot. notti		5	5	5	5	5	5	5	5	5				20,00	20,00	5,00	
	Agenti utilizzabili in lavori notturni n°	Media agente	0,0	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,0	0,0	0,0	2,22	2,22	0,56
	NAM1LV11	Tot. notti		15	15	15	15	15	15	15	15	15				60,00	60,00	15,00	
	Agenti utilizzabili in lavori notturni n°	Media agente	0,0	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	0,0	0,0	0,0	6,67	6,67	1,67
	NAM1LV12	Tot. notti	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	15,00	12,00	12,00	
	Agenti utilizzabili in lavori notturni n°	Media agente	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	1,36	1,09	1,09	
	NAM1LV13	Tot. notti	16	21	16	16	10	19	10	10	10	10	10	5	5	5	79,00	49,00	25,00
	Agenti utilizzabili in lavori notturni n°	Media agente	1,6	2,1	1,6	1,6	1,0	1,9	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,5	0,5	0,5	7,90	4,90	2,50
	NAM1LV14	Tot. notti	3	13	13	13	10	22	10	10	10	10				52,00	52,00	10,00	
	Agenti utilizzabili in lavori notturni n°	Media agente	0,3	1,2	1,2	1,2	0,9	2,0	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,0	0,0	0,0	4,73	4,73	0,91
	NAM1LV15	Tot. notti																	
	Agenti utilizzabili in lavori notturni n°	Media agente	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
	NAM1TE09	Tot. notti	15	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	15	15	15	95,00	80,00	65,00
	Agenti utilizzabili in lavori notturni n°	Media agente	1,2	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,2	1,2	1,2	7,31	6,15	5,00
	NAM1TE11	Tot. notti	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	45,00	36,00	36,00	
	Agenti utilizzabili in lavori notturni n°	Media agente	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	5,63	4,50	4,50	
	NAM1TE12	Tot. notti	15	16	12	11	10	22	10	10	10	10	10	5	5	5	64,00	52,00	25,00
	Agenti utilizzabili in lavori notturni n°	Media agente	1,9	2,0	1,5	1,4	1,3	2,8	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	0,6	0,6	0,6	8,00	6,50	3,13
	NAM1TE14	Tot. notti	8	15	12	12	10	14	10	10	10	10	10	5	5	5	57,00	44,00	25,00
	Agenti utilizzabili in lavori notturni n°	Media agente	0,9	1,7	1,3	1,3	1,1	1,6	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	0,6	0,6	0,6	6,33	4,89	2,78
